



RELATÓRIO – MEDIÇÃO 2º ADITIVO

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.**

CONTRATADA: **TOWER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**, objeto do Contrato N° 24/2020, PO 23/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, referentes ao 2º Termo Aditivo.

Esta medição do 2º Termo Aditivo atingiu o valor de **R\$ 2.305,81 (Dois mil, trezentos e cinco reais e oitenta e um centavos)**, que corresponde a um percentual de 100,00% para a medição e 100,00% acumulado.

I. ITENS A SEREM ADITIVADOS EXISTENTES EM PLANILHA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

I.2.1 - CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

I.2.2 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

Executada a complementação de área de caixilho e vidro temperado fixo, sobre a porta de vidro temperado instalada na fachada de vidro do edifício.



Figura 01 – área de caixilho e vidro temperado complementada

Total financeiro executado no item ITENS A SEREM ADITIVADOS EXISTENTES EM PLANILHA	R\$ 1.438,08 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.438,08 acumulado (100,00% do total em planilha)

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA.

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100,00%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

II.1.1 - CABO DE AÇO 5/32"

II.1.2 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO - 5/16"

II.1.3 - ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - 3/8" – MALEÁVEL

II.1.4 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Executada a estrutura de estaiamento das paredes steel frame, da cobertura e das abas frontal e de fundos da edificação.

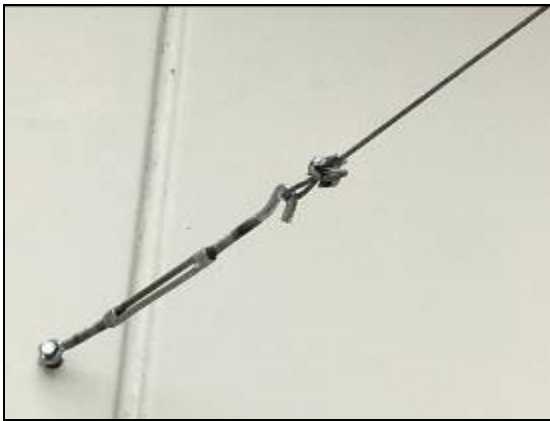


Figura 02 – Esticador, cabo, grampos



Figura 03 – Estrutura steel frame estaiada.

II.1.5 - Soleira em granito Cinza andorinha 0,20x0,9

Executada soleira de granito sob a porta de vidro temperado



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Total financeiro executado no item ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA	R\$ 1.200,95 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.200,95 acumulado (100,00% do total em planilha)

III. ITENS GLOSADOS (Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

III.1.1– 26,40 m2 de TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 6X PARA FECHAMENTO EXTERNO RESERVATÓRIO POLIETILENO 16.000 L - AQUALIMP OU SIMILAR

Total financeiro não medido na planilha de contrato	R\$ 1.176,46 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 1.176,46 acumulado (100,00% do total em planilha)

Total glosado	R\$ -1.509,68 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ -1.509,68 acumulado (100,00% do total em planilha)

Saldo da Medição	R\$ -333,22 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ -333,22 acumulado (100,00% do total em planilha)



DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição do 2º Termo Aditivo foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição do 2º Termo Aditivo.

DOS ANEXOS

- Planilha;

Curitiba, 15 de dezembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Sandro Pohl da Silva
Membro

Gilberto Ditzel
Membro
