



RELATÓRIO MEDIÇÃO – 2º ADITIVO

FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO

OBRA: **Cobertura, Pintura e Adequações de acessibilidade – TP 02/2022**

CONTRATADA: **Ferragens Donda – Materiais e Serviços de Engenharia.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização das **ADEQUAÇÕES E REFORMA DO FÓRUM TRABALHISTA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR**, objeto do Contrato N° 32/2022, TP02/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 18/11/2022 (data do início da medição 2º aditivo) até 16/12/2022 (data da vistoria da medição 2º aditivo).

–
Esta medição do 2º aditivo da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 6.641,95 (seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos)**, que corresponde a um percentual de 100% para a medição e 100,00% acumulado.

A medição do 2º aditivo ocorreu cerca de 96 dias após a data de início da obra.

1. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS –GND3

I. ITENS ADITIVADOS EXISTENTES NA PLANILHA.

Nesta medição foi considerado um percentual de execução de 100,00%, com acumulado de 100%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

ITEM I.1 Complemento de tubos para águas pluviais.



ITEM 1.2 Complemento de Pintura em plataforma metálica – fundos.







ITEM 1.3 Remoção de piso intertravado – recuo garagem.



ITEM 1.4 Reinstalação de paver.

ITEM 1.5 Piso tátil externo em toda a testada principal.



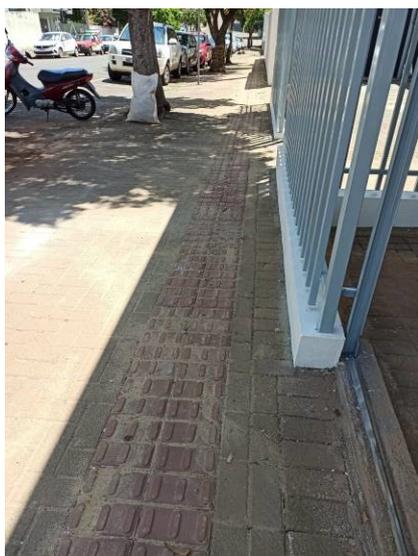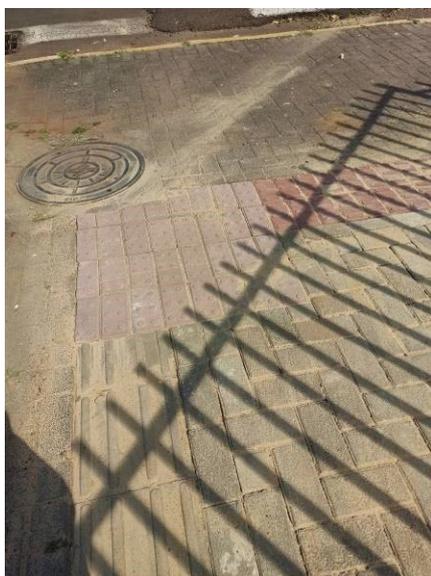

ITEM 1.6 Kit automação do portão, entrada vaga PNE.



Total financeiro executado no item ITENS ADITIVADOS EXISTENTE NA PLANILHA	R\$ 6.482,09 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 6.482,09 acumulado (100,00% do total em planilha)

II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA.

ÍTEM II.1. Fornecimento e instalação de cumeeira no telhado.



ÍTEM II.2. Relocação de equipamentos de ar condicionado, no telhado. Devido a alteração de altura da cobertura.



ITEM II.3. Contrapiso em área de acesso a garagem.

ITEM II.4. Piso em concreto para acesso veículos.





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Coordenadoria de Projetos e Planejamento

Total financeiro executado no item ITENS ADITIVADOS EXTRA PLANILHA	R\$ 9.151,26 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 9.151,26 acumulado (100,00% do total em planilha)

III. ITENS A SEREM GLOSADOS.

ÍTEM III.1. Chapim – rufo sobre a platibanda.

Total financeiro executado no item ITENS A SEREM GLOSADOS	R\$ 8.991,40 na etapa (100,00% do total em planilha)
	R\$ 8.991,40 acumulado (100,00% do total em planilha)

II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à medição do aditivo.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Coordenadoria de Projetos e Planejamento

Curitiba, 20 dezembro de 2022.

Benedy Antunes de Oliveira
Comissão de Fiscalização TP02/22

Paulo Roberto dos Santos
Comissão de Fiscalização TP02/22

Regina Ciscato de Lima
Comissão de Fiscalização TP02/22
