

## **RELATÓRIO – 3ª MEDIÇÃO**

OBRA: **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO.**

CONTRATADA: **D. F. CRIPA CONSTRUÇÕES LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÕES DO EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato Nº 40/2022, PO 37/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 21/12/2022 até 30/01/2023 (40 dias após a última medição).

Esta 3ª medição da planilha contratual atingiu o valor de **R\$ 92.970,58 (noventa e dois mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos)**, que corresponde a um percentual de 15,95 % para a medição e 27,98% acumulado.

### **I. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.**

#### **1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS.**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 17,83%, com acumulado de 81,72%%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

Mestre de obras: Desde o início dos serviços e durante toda a etapa, houve a atuação de mestre de obras contratado pela empresa.



	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO</b> <b>Secretaria de Engenharia e Arquitetura</b>
---	---

<b>Total financeiro executado no item ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS INICIAIS</b>	R\$ 3.518,59 na etapa (17,83%% do total em planilha)
	R\$ 16.126,71 acumulado (81,71% do total em planilha)

## 2. REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - DENTRO DO ALINHAMENTO PREDIAL -

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 18,35%, com acumulado de 28,28%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica; (Figuras 01, 02, 03 e 04)
- Regularização de contrapiso com argamassa; (Figuras 01, 02, 03 e 04)





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**



Figura 03



Figura 04

Total financeiro executado no item <b>REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - DENTRO DO ALINHAMENTO PREDIAL</b>	R\$ 19.568,69 na etapa (18,35% do total em planilha)
	R\$ 30.157,30 acumulado (28,28% do total em planilha)

### **3. REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - PASSEIO (FACHADA CARLOS DE CARVALHO)**

Não foram executados serviços nesta etapa.

### **4. REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS - PASSEIO (FACHADA VISCONDE DO RIO BRANCO)**

- Demolição do petit pavê existente;


Relatório 3ª Medição – PO 37/2022 - Página 3 de 9

PROAD 509/2023. DOC 3. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.CYQK.FMPL: <https://www.trt9.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>



	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO</b> <b>Secretaria de Engenharia e Arquitetura</b>
---	---

- Assentamento do petit pavê reaproveitado e novo; (Figuras 05 e 06)

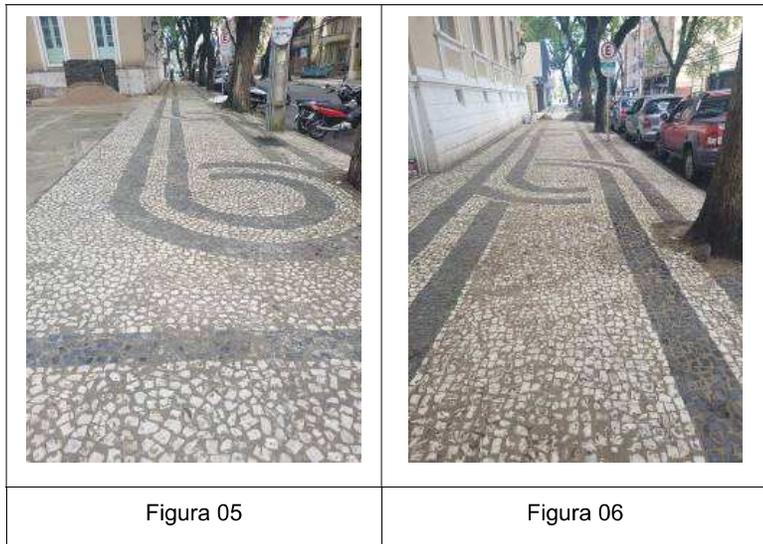

Total financeiro executado no item <b>REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS – VISCONDE DO RIO BRANCO)</b>	R\$ 10.986,74 na etapa (31,91% do total em planilha)
	R\$ 27.676,14 acumulado (80,38% do total em planilha)

#### **5. SUBSTITUIÇÃO DE PISO EXISTENTE NA LATERAL DO CASARÃO**


Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **6. PREPARO E PINTURA DA RAMPA METÁLICA**

Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **7. MURO E PORTÃO EM VIDRO LAMINADO 4 + 4 MM COLOCADO**





Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **8. REMOÇÃO DE PLACAS DE GESSO ACARTONADO DO CASARÃO**

Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **9. LIMPEZA DE CALHAS E DESENTUPIMENTO DE PRUMADAS**

Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **10. PINTURA - PAREDES HALL ELEVADORES E ESCADAS**

Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **11. TROCA DE REGISTROS NA REDE DE HIDRANTES**

Não foram executados serviços nesta etapa.

#### **12. ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA SGP (COBERTURA)**

Nesta etapa foi considerado um percentual de execução de 42,18%, com acumulado de 48,65%. Este percentual corresponde à execução dos seguintes serviços:

- Caçamba e remoção da entulho da demolição do piso existente;
- Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. (parede);
- Demolição de argamassas (contrapiso), de forma manual, sem reaproveitamento;
- Remoção dos toldos existentes;
- Instalação do pergolado de madeira fixado na laje; (Figuras 07 e 08)
- Revestimento cerâmico 20x120 cm com acabamento tipo madeira para o piso e revestimentos das floreiras; (Figuras 09 e 10)





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

- Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm;
- Preenchimento das floreiras com as vegetações reaproveitadas; (Figuras 09 e 10)
- Instalação de buzinetes; (Figuras 11 e 12)





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**



Figura 07



Figura 08



Figura 09



Figura 10



	<b>TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO</b> Secretaria de Engenharia e Arquitetura
---	--



<b>Total financeiro executado no item ADEQUAÇÕES NO TERRAÇO DA SGP (COBERTURA)</b>	R\$ 58.896,57 na etapa (42,18% do total em planilha)
	R\$ 67.928,17 acumulado (48,65% do total em planilha)


### 13. PINTURA DE SECRETARIA DE GABINETE AFETADA PELA INFILTRAÇÃO DAS FLOREIRAS DA COBERTURA

Não foram executados serviços nesta etapa.

## II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 3ª medição foram executados de acordo com o especificado e de acordo com os percentuais levantados conforme planilha em anexo, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 3ª medição.





### III. DOS ANEXOS

- Planilha de medição;

Curitiba, 01 de fevereiro de 2023.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

Cláudia Freda Soares Dal Piva  
Membro

---

Rogério Esmanhotto  
Membro

