



**RELATÓRIO – 3ª MEDIÇÃO  
(UNIDADES CASCAVEL E FOZ DO IGUAÇU)**

**OBJETO: SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA  
CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID),  
NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO.**

**CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO**, objeto do Contrato N° 56/2022, PO 43/2022, VETOR 283128, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório de recebimento da segunda etapa (Fornecimento e Instalação dos materiais e equipamentos) relativa aos imóveis Fórum Trabalhista de Cascavel PR e Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu PR.

Esta 3ª medição atingiu o valor de **R\$ 317.014,80 (trezentos e dezessete mil e catorze reais e oitenta centavos)**, que corresponde a um percentual de 60% para a medição e 70% acumulado considerando-se exclusivamente os imóveis de Cascavel e Foz do Iguaçu PR e, caso se considere o total do contrato, 19,99% para a etapa e 41,37% para o total, conforme previsto no cronograma item 6.2 do edital.

A entrega dos materiais e equipamentos dos imóveis de Cascavel-PR e Foz do Iguaçu-PR ocorreram nas datas de 09/03 e 10/03/2023, sendo a conclusão da instalação e vistoria ocorrido na data de 22/03/2023. A conclusão da etapa 2 nesses imóveis ocorreu 148 dias após o Termo de Início, estando em atraso parcial na etapa, entretanto mantido o prazo final de 26 de abril de 2023, conforme termo aditivo em andamento.

## I. SERVIÇOS EXECUTADOS.

### I.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Nesta etapa, a contratada forneceu e instalou os equipamentos para a unidade de Cascavel 120 placas fotovoltaicas marca SUNOVA modelo SS-555-72MDH e 2 inversores marca DEYE, ambos modelo SUN-30K-G02-LV.

Nesta etapa, a contratada forneceu e instalou os equipamentos para a unidade de Foz do Iguaçu 150 placas fotovoltaicas marca SUNOVA modelo SS-555-72MDH e 2 inversores marca DEYE, **modelos SUN-35K-G02-LV e SUN-40K-G02-LV**

Os inversores e proteções foram instalados no barrilete, com acesso pela sala técnica.

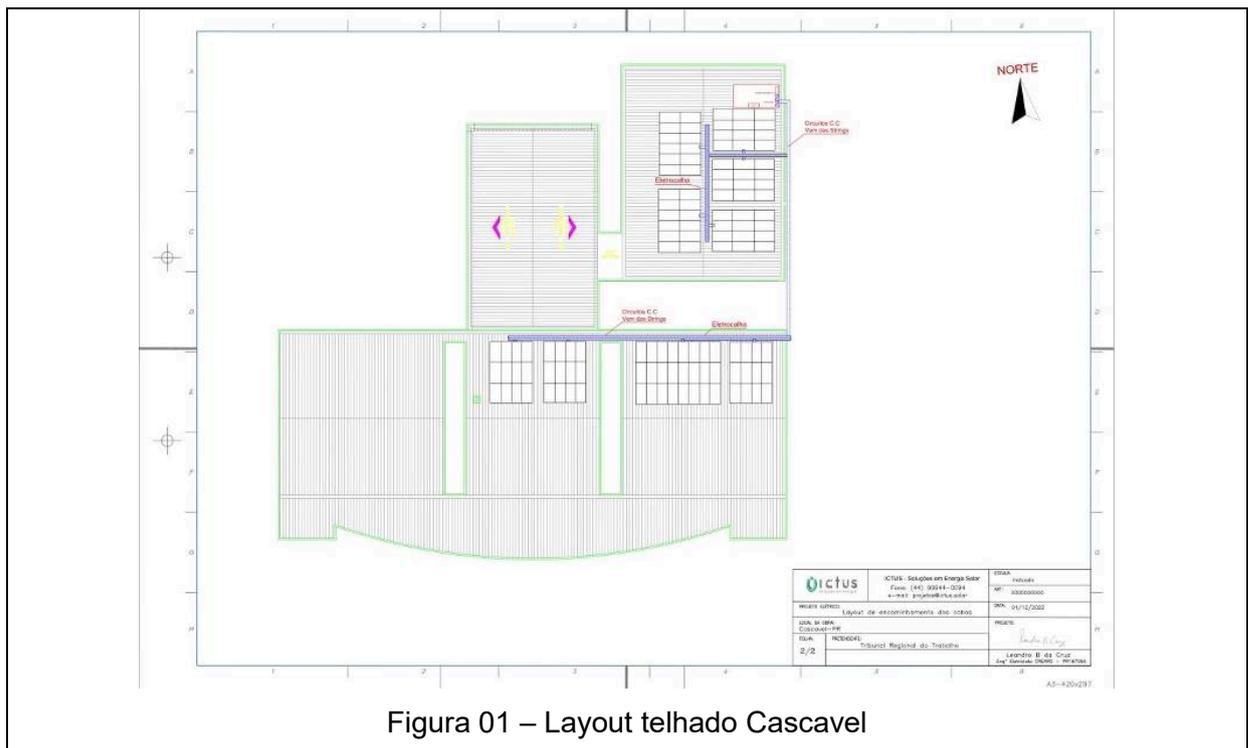


Figura 01 – Layout telhado Cascavel



Figuras 02 – Cobertura com placas instaladas - Cascavel





Figura 04 – Layout telhado Foz do Iguaçu





Figuras 05 – Cobertura com placas instaladas – Foz do Iguaçu



Figura 06 – Inversores e ligação elétrica – Foz do Iguaçu

Total financeiro executado no item etapa 2 (Cascavel e Foz do Iguaçu):	R\$ 317.014,80 na etapa
	R\$ 655.980,02 acumulado (41,37% do total em planilha, para o contrato)



## **II. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Considerando-se que os serviços incluídos nesta 3ª medição foram executados de acordo com o especificado, a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à 3ª medição.

## **III. DOS ANEXOS**

- Consolidação das medições

Curitiba, 23 de março de 2023.

---

Gilberto Ditzel  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro

---

Heron Cazarim Marroni  
Membro
