

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 2ª MEDIÇÃO

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA VARA TRABALHISTA DE BANDEIRANTES**
CONTRATADA: **CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA.**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONSTRUÇÃO DA VARA TRABALHISTA DE BANDEIRANTES**, objeto do Contrato Nº 085/2015, CP 03/2015, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 05/02/2016 até 05/03/2016.

I. SERVIÇOS

I.2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



Figura 01C: Módulo sanitário - detalhe do chuveiro



Figura 02C: Módulo sanitário - detalhe do vaso sanitário

I.3. MOVIMENTO DE TERRA



Figura 03C: Vala executada, para baldrame



Figura 04C: Abertura de vala para execução de bloco de fundação



Figura 05C: Abertura de valas para execução de baldrame e blocos



Figura 06C: Abertura de vala para execução de bloco de fundação

I.4. INFRA-ESTRUTURA



Figura 07C: Detalhe de estacas arrasadas e cabeças preparadas para receberem bloco de fundação



Figura 08C: Detalhe de estacas arrasadas e cabeças preparadas para receberem bloco de fundação concretadas



Figura 09C: Detalhe de forma e armaduras de bloco de fundação



Figura 10C: Bloco para 1 estaca com forma pronta



Figura 11C: Baldrames e blocos com formas prontas, recebendo armaduras



Figura 12C: baldrames com formas prontas - detalhe do colchão de brita no fundo da viga



Figura 13C: Formas de vigas e suas respectivas armaduras sendo instaladas



Figura 14C: Armador instalando ferragem em bloco e viga baldrame



Figura 15C: Baldrames e blocos com formas prontas, recebendo armaduras



Figura 16C: Bloco com armaduras já instaladas



Figura 17C: Bloco com armaduras já instaladas



Figura 18C: Bloco com armaduras já instaladas



Figura 19C: Baldrames com armaduras já instaladas



Figura 20C: armador preparando armadura de bloco



Figura 21C: Baldrames concretadas



Figura 22C: Baldrames e blocos concretados



Figura 23C: Baldrames e blocos concretados



Figura 24C: Baldrames e blocos concretados



Figura 25C: detalhe de bloco, após desforma



Figura 26C: Detalhe de baldrame, após desforma



Figura 27C: Detalhe de baldrame, após desforma



Figura 28C: Detalhe de baldrame, após desforma



Figura 29C: Detalhe das formas dos blocos de fundação, antes da colocação



Figura 30C: Detalhe das armaduras dos blocos, antes da instalação



Figura 31C: Detalhe dos arranques dos pilares, antes da instalação



Figura 32C: Detalhe das armaduras de pilares, antes da instalação das formas e concretagem

I.5. SUPRA-ESTRUTURA



Figura 33C: Formas e escoramento de pilares



Figura 34C: Detalhe de forma para pilar



Figura 35C: Detalhe da concretagem de pilares



Figura 36C: Uso de vibrador de imersão, durante concretagem de pilar



Figura 37C: Pilares concretados, aguardando prazo para desforma



Figura 38C: Pilares já desformados

I.9. IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS



Figura 39C: Vigas baldrames com aplicação de impermeabilizante



Figura 40C: Detalhe da aplicação de impermeabilizante em bloco de fundação

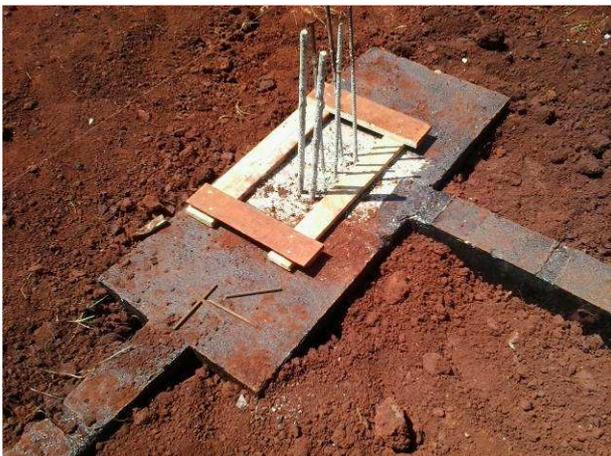


Figura 41C: Bloco de fundação e vigas baldrames, após aplicação de pintura impermeabilizante



Figura 42C: Vigas baldrames com aplicação de impermeabilizante



Figura 43C: Vigas baldrames e bloco com aplicação de impermeabilizante



Figura 44C: Viga baldrame e bloco com aplicação de impermeabilizante



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

Curitiba, 10 de março de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro
