

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 1ª MEDIÇÃO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA

CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO IMÓVEL DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA, objeto do Contrato N° 026/2016, PO 05/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 21/06/2016 até 27/07/2016 (primeira etapa).

SERVIÇOS

1 . ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS



Figura 01C: Placa de obra, fixada sobre o



Figura 02C: Detalhe da placa de obra

2 . INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES



Figura 03C: Caçamba para remoção de



Figura 04C: Demolição do piso do arquivo

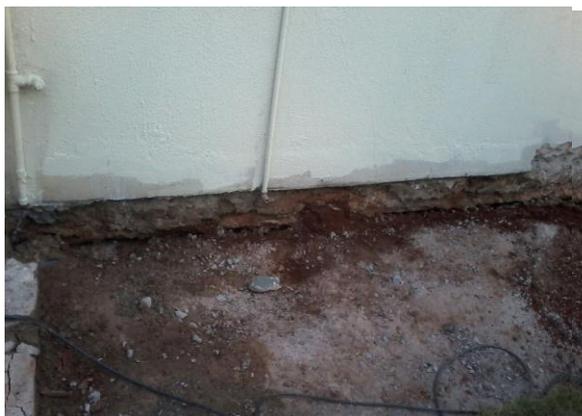


Figura 05C: Demolição da calçada lateral



Figura 06C: Demolição da calçada lateral



Figura 07C: Demolição da calçada lateral



Figura 08C: Demolições de rebôco em



Figura 09C: Lona plástica protegendo equipamentos e mobiliário



Figura 10C: Demolição da viga falsa que sustentava o aparelho de ar condicionado

3 . EXECUÇÃO DRENO



Figura 11C: Abertura da vala de drenagem



Figura 12C: Instalação do tubo corrugado



Figura 13C: Detalhe de uma das duas saídas dos drenos

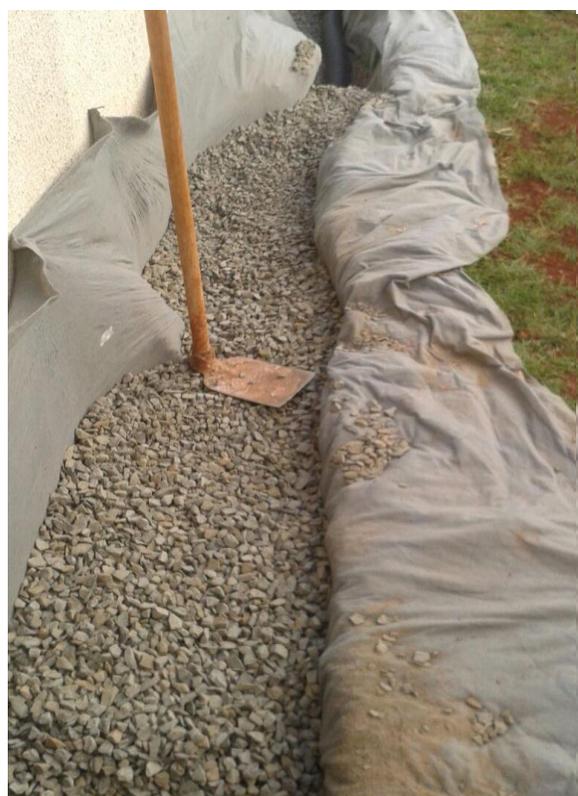


Figura 14C: preenchimento da vala com brita



Figura 15C: Detalhe da vala com tubo e brita envoltos pelo bidim



Figura 16C: Vala de drenagem já com o fechamento da manta bidim

4 . PAREDES E PAINÉIS



Figura 17C: Junta sendo tratada

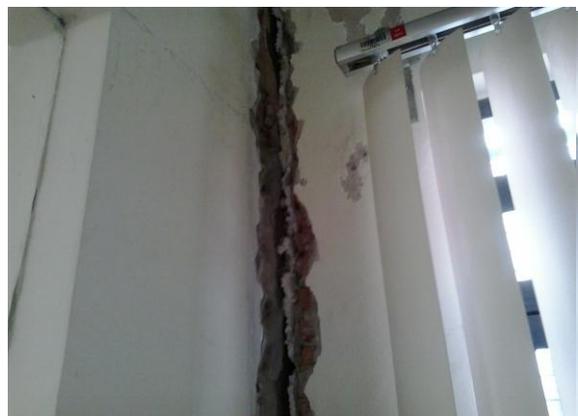


Figura 18C: Escarificação de junta de dilatação, para posterior tratamento

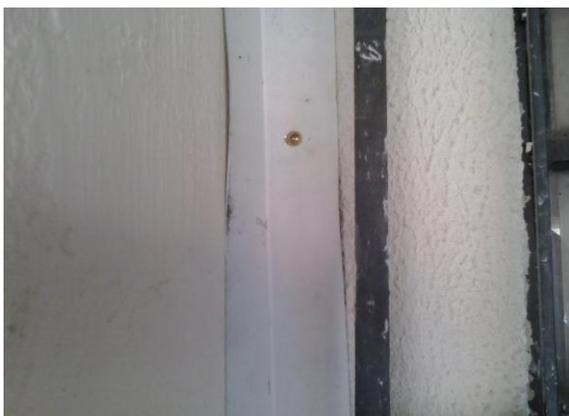


Figura 19C: Aplicação de perfil na junta tratada



Figura 20C: Demolição de rebôco em fissura



Figura 21C: Demolição de rebôco em fissura



Figura 22C: Demolição de rebôco em fissura



Figura 23C: Aplicação de tela de passarinho no perímetro de fissura



Figura 24C: Detalhe da aplicação de tela de passarinho em fissura



Figura 25C: Rebôco realizado sobre fissura já tratada

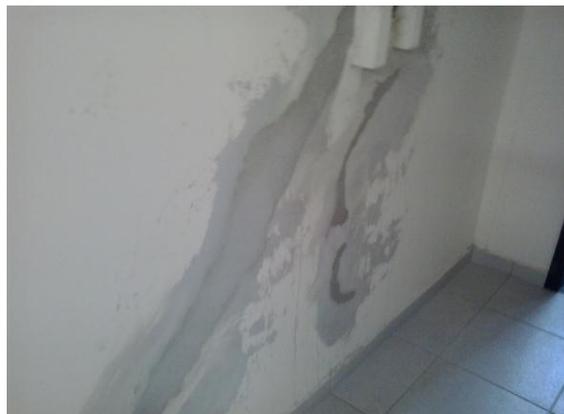


Figura 26C: Rebôco realizado sobre fissura já tratada



Figura 27C: Rebôco realizado sobre fissura já tratada



Figura 28C: Rebôco realizado sobre fissura já tratada

5 . ESQUADRIAS



Figura 29C: Instalação de porta de alumínio tipo veneziana, tamanho 90x210cm, na entrada do arquivo

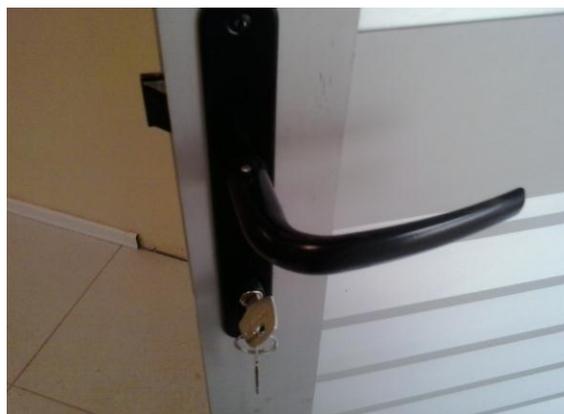


Figura 30C: Detalhe da fechadura da porta instalada na entrada do arquivo

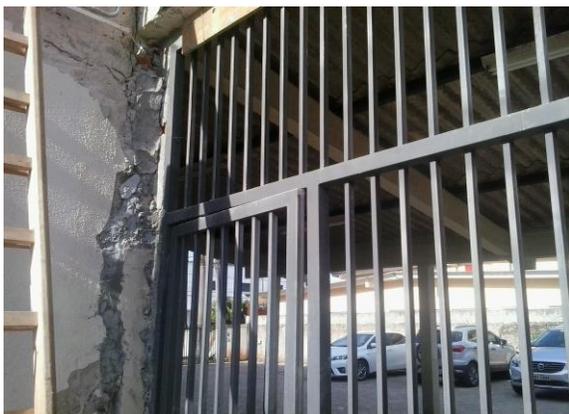


Figura 31C: Instalação do gradil com portão, na parte coberta do estacionamento



Figura 32C: Instalação do gradil com portão, na parte coberta do estacionamento

6 . COBERTURA



Figura 33C: Rufo instalado sobre a cobertura localizada no estacionamento



Figura 34C: Rufo instalado sobre o arquivo (divisa lateral direita do imóvel)



Figura 35C: Rufo instalado sobre o arquivo (divisa lateral direita do imóvel)



Figura 36C: Rufo instalado sobre a escada de acesso ao segundo pavimento

8 . PISOS INTERNOS/EXTERNOS



Figura 37C: Aplicação de contrapiso no arquivo - detalhe da tela soldada



Figura 38C: Piso cerâmico Eliane cargo plus, instalado no arquivo



Figura 39C: Aplicação de contrapiso nos trechos demolidos do arquivo



Figura 40C: Camada de base da calçada externa, após apiloamento



Figura 41C: Camada de base da calçada externa, após apiloamento

9 . RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

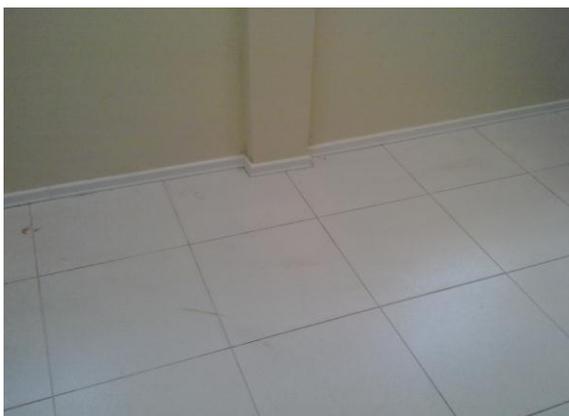


Figura 42C: Rodapé Santa Luzia, instalado no arquivo

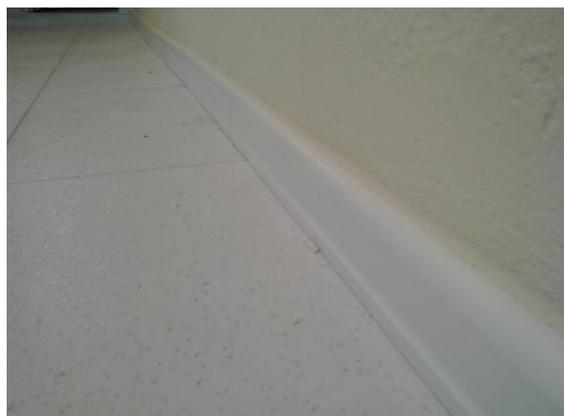


Figura 43C: Detalhe de rodapé Santa Luzia, instalado no arquivo



Figura 44C: Soleira de granito cinza andorinha, instalada sob porta de acesso ao arquivo



Figura 45C: Soleira de granito cinza andorinha, instalada sob porta de acesso ao arquivo

10 . INSTALAÇÕES



Figura 46C: Aparelho de ar condicionado removido e reinstalado (agora fixado no teto)



Figura 47C: Aparelho de ar condicionado removido e reinstalado (agora fixado no teto)

11 . PINTURAS



Figura 48C: Pintura de muro (lateral direita)



Figura 49C: Pintura de muro (fundos)



Figura 50C: Pintura de sala de audiência

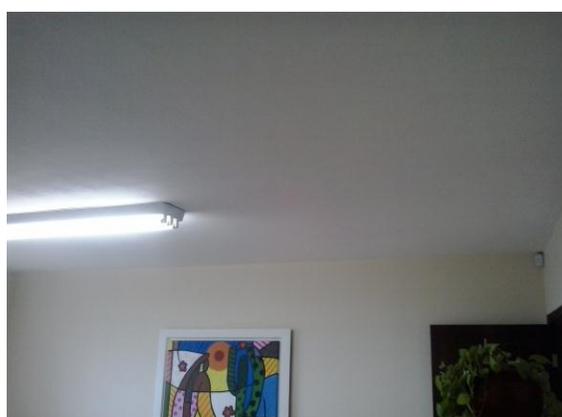


Figura 51C: Pintura de gabinete

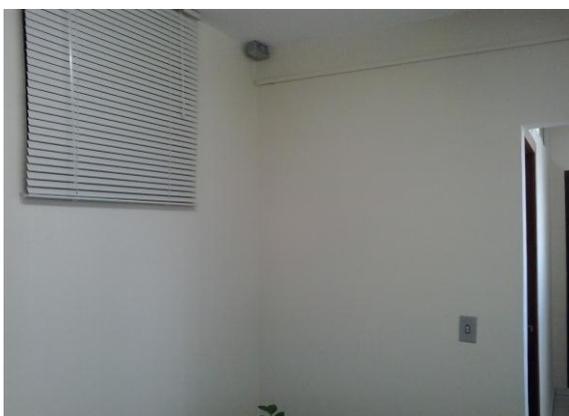


Figura 52C: Pintura de gabinete



Figura 53C: Pintura de parede externa



Figura 54C: Pintura da fachada frontal



Figura 55C: Pintura da fachada lateral



Figura 56C: Pintura do gradil de fechamento do estacionamento (fundos)



Figura 57C: Pintura de portão e gradil de fechamento do estacionamento

Curitiba, 01 de agosto de 2016.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro

Kelvi Leandro da Silva
Membro
