



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

DANIEL
VICENTE
THOMAZ 01
/08/2022 ST1
TRT9

RICARDO
ERBANO 01
/08/2022
NAGTI TRT9

**Processo: Reunião de Comissão ordinária COGESTIC 18/07
/2022 (Proc. N° 286154)**

Ata/Pauta (ID 8037511)

Agendamento (ID 8037512)

Data: 18/07/2022

Horário: 14:00 até 15:30

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

- Alexandre Tetsuo Yamauchi
- Daniel Vicente Thomaz
- Eladir Prados
- Luciano Kuehne
- Omar Carvalho
- Paulo Roberto Nunes
- Maria Helena Franco Martins Alves
- Ricardo Erbano
- Walter Ribeiro de Oliveira Junior
- Francisco Riedi
- Celimar Lucia Gobetti
- Robson Cleiton Novak
- Roverli Pereira Ziwich
- Robson Cleiton Novak
- Hugo Signoretti Netto
- Luciano Drosda Marques Dos Santos

Local da reunião: Sala do zoom

Participantes:

- Daniel Vicente Thomaz
- Eladir Prados
- Luciano Kuehne
- Maria Helena Franco Martins Alves
- Ricardo Erbano
- Walter Ribeiro de Oliveira Junior
- Francisco Riedi



Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Reunião de Comissão ordinária COGESTIC 18/07/2022 (N° 286154)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.BHYGK.JAAPT no endereço eletrônico:
https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

- Celimar Lucia Gobetti
- Robson Cleiton Novak
- Hugo Signoretti Netto
- Luciano Drosda Marques Dos Santos

Itens da reunião (ID 8037519)

Item 1 - Apresentação/acompanhamento orçamento STI (ID 8037520)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento STI.

Descrição:

Celimar Lucia Gobetti começou apresentando painel de execução orçamentária (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/Vetor/Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria?rs:embed=true>).

Celimar, apresentou o valor total e execução até maio, total planejado e total executado até maio e os indicadores de grau de execução.

Celimar foi informando os itens que não tiveram execução de 100% do planejado.

Cada gestor foi informando o motivo para a contratação não ter o valor executado.

Celimar, apresentou as contratações que ainda não foram tramitadas.

Eladir informou que está tendo atraso no pagamento do service desk mas que a pendencia para o pagamento não é com a STI.

Hugo informou que as duas contratações da DINP (manutenção DCs e servidores de rack) atrasaram por não termos recebido propostas comerciais suficientes para embasar o estudo.

Cada gestor da área foi detalhando o motivo para a contratação não ter sido ainda tramitada e o que estava sendo feito para corrigir o problema.

Celimar também apresentou duas propostas diferentes para o momento de confecção do DOD.

Solução Proposta:

Melhorar o acompanhamento das diárias trazendo mais informações para o relatório.

Deliberação:



Robson Cleiton Novak atualizar as informações das contratações referentes a segurança da informação.

Os responsáveis pela Subseção de controle de recursos devem informar nas próximas apresentações destacar o valor do saldo orçamentário (sobra ou déficit).

Hugo Signoretti Netto verificar as contratações da infra que tiveram atrasos no envio para a ODESP.

Os responsáveis pela Subseção de controle de recursos devem aprimorar as informações de diárias.

Subseção de controle de recursos deverá destacar as diárias que estão atrasadas (do que foi planejado), as diárias que devem ser executadas nos próximos 30 dias e informar se tem valores de diárias para serem aprovados.

Daniel Thomaz irá decidir futuramente o momento correto da confecção do DOD.

No momento da apresentação foi analisado o plano e não foi identificada nenhuma sobra orçamentária.

anexo: [Download: Image20220719090634.png](#)

(8037560) anexo: [Download: Image20220719090848.png](#)

(8037559) anexo: [Download: Image20220719090857.png](#)

(8037558) anexo: [Download: paineis reunião 18-07.docx](#)

(8037557) anexo: [Download: reunião 18-07-paineis.pptx](#)

(8037556) anexo: [Download: Saldo orçamentário-reunião 18-07.xlsx](#)

Item 2 - Acompanhamento capacitações STI (ID 8037530)

Nome do item: Acompanhamento capacitações STI.

Descrição:

Francisco Riedi apresentou um novo painel criado para o controle das capacitações da STI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/STI%20Capacita%C3%A7%C3%A3o?rs:embed=true>), com atualizações até 20/06/2022.

Durante a reunião foram feitas análises pelos gestores de cada uma das contratações de capacitação que não foram executadas.

Francisco também informou que há uma mudança na forma de contratação das licenças rotativas da plataforma Alura.

Renovações contratuais ou novas contratações seguem o novo modelo onde o acesso é nominado, ou seja, um acesso para cada pessoa a ser treinada.

Francisco informou que, sob essa nova forma de licenciamento, a contratação para toda a STI será muito maior do que o atual e assim isto acabe inviabilizando a renovação ou nova contratação da plataforma.



DANIEL
VICENTE
THOMAZ 01
/08/2022 STI
TRT9



RICARDO
ERBANO 01
/08/2022
NAGTI TRT9



Foi solicitada uma proposta/cotação da empresa considerando essa modalidade para efeito de comparação.

Daniel Thomaz demonstrou preocupação com a quantidade de capacitações aprovadas que de alguma forma não se realizaram ou tiveram a contratação frustrada.

Solução Proposta:

Informar a data de início das capacitações que ainda não tem data definida.

Reavaliar como essas capacitações estão sendo planejadas/selecionadas e evitar essa situação para o próximo ano.

Deliberação:

Robson Cleiton Novak verificar junto com a equipe de infraestrutura para definir uma data para a contratação do MySQL e providenciar a documentação necessária.

A decisão sobre renovação ou nova contratação da plataforma Alura será tomada oportunamente neste ano.

Francisco Riedi solicitar aos gestores que informem as outras capacitações para serem incluídas nas que estavam para serem executadas foram frustradas.

anexo: [Download: Image20220720103137.png](#)

(8037563) anexo: [Download: Image20220720103152.png](#)

(8037562) anexo: [Download: Image20220720103156.png](#)

(8037561) anexo: [Download: Image20220720103203.png](#)

Item 3 - Apresentação/acompanhamento andamento projetos STI (ID 8037536)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento projetos STI.

Descrição:

Walter Ribeiro de Oliveira Junior apresentou o andamento dos projetos atuais da STI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/COGESTIC>).

Walter foi repassando os projetos que estão atrasados na Secretaria.

Walter informou que ficou responsável pelos projetos relacionados a resolução CNJ 370 com a realocação do Jaime em projetos da LGPD.



Walter mostrou que agora é possível descobrir quais projetos uma pessoa está alocada e também ver quais pessoas estão alocadas para um projeto específico.


DANIEL
VICENTE
THOMAZ 01
/08/2022 STI
TRT9


RICARDO
ERBANO 01
/08/2022
NAGTI TRT9

Solução Proposta:

Luciano Kuehne sugeriu que as demandas fossem antes repassadas para o setor de projetos para depois serem avaliadas pela unidade.

Deliberação:

Walter assegurar que os projetos internos tenham solicitação de mudança quando necessário.

Gestores devem informar o Walter caso algum projeto esteja sendo executado ou demandado e ainda não esteja na lista.

Ricardo Erbano incluir na pauta da próxima reunião ordinária um tópico para discutir uma forma de melhorar o acompanhamento dos produtos da STI e se este acompanhamento será feito pela equipe de projetos.

Daniel Thomaz solicitou que continue, pelo menos por enquanto, sendo feita uma avaliação inicial pelas unidades da STI das demandas e depois da análise caso identifique-se a necessidade de um projeto o mesmo seja repassado para o escritório de projetos.

Walter fazer juntamente com os responsáveis pelos projetos regularizar a situação dos projetos atrasados, formalizando o novo escopo e prazo, finalizando ou suspendo a execução dos projetos quando for necessário.

Walter fazer um acompanhamento do projeto Sincc para verificar se o houve homologação do produto e caso necessário fornecer um novo prazo para término da homologação.

anexo: [Download: Image20220720094725.png](#)

Item 4 - Apresentação painel acompanhamento de pendencias vetor (ID 8037542)

Nome do item: Apresentação painel acompanhamento de pendencias vetor.

Descrição:

Ricardo Erbano reapresentou o painel que mostra as pendencias de preenchimento no sistema vetor ([https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/Vetor/Avalia%C3%A7%](https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/Vetor/Avalia%C3%A7%20de%20pendencias)



Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Reunião de Comissão ordinária COGESTIC 18/07/2022 (Nº 286154)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.BHYGK.JAAPT no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

).

Conforme acordado, na última reunião ordinária do COGESTIC, o foco deveria ser zerar as pendências dos dados de contratação atrasados.

Ricardo Erbano apresentou duas comparações das informações atuais do painel confrontando com dados do painel desde a última reunião ordinária do COGESTIC.

A primeira era uma comparação dos processos/dados atrasados no vetor do modelo de contratação que a STI é responsável da situação atual versus mês de junho.

A segunda comparação era dos processos/dados atrasados no vetor de todos os modelos que a STI é responsável da situação atual versus mês de junho.

Ricardo então focou a apresentação nas pendências dos processos dos modelos de contratação.

Solução Proposta:

Pequenas melhorias visuais no painel de pendência para preenchimento do sistema vetor para ficar mais intuitiva as informações.

Deliberação:

Ricardo Erbano providenciar as melhorias visuais sugeridas durante a reunião no painel de preenchimento.

Robson verificar as pendências do DSIR e Hugo com o Alexandre Tetsuo as pendências dos processos de contratação da DINP apresentadas no painel.

Ricardo Erbano agendar uma reunião com os chefes de divisão que tiverem dúvidas sobre o preenchimento dos modelos de processos de trabalho e serviços.



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



R\$ 14.382.739,76
Orçamento

R\$ 3.387.903,06
Executado

R\$ 10.994.836,70
Saldo acumulado

R\$ 7.515.833,68
Empenhado


R\$ 6.866.906,08
Saldo não Empenhado

74,39%
Grau de Execução


23,56%
% Executado

52,26%
% Empenhado

Programação e Execução Orçamentária

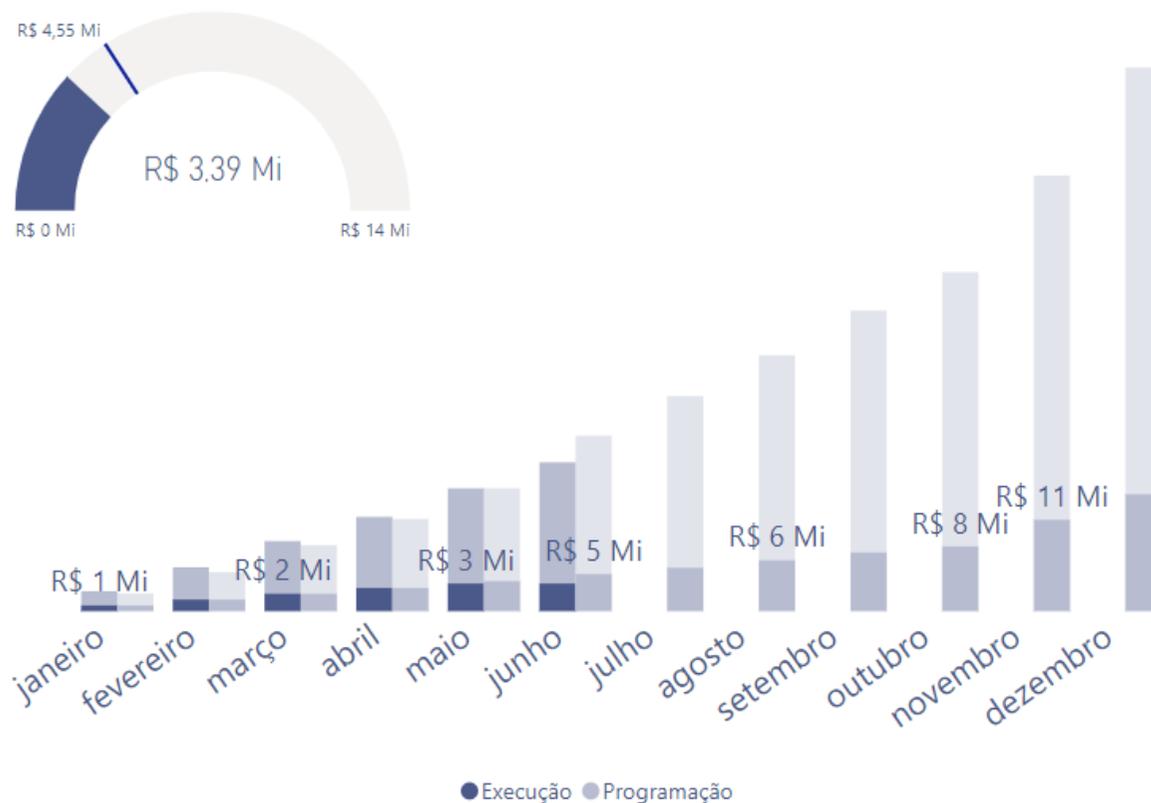

% Executado por Setor

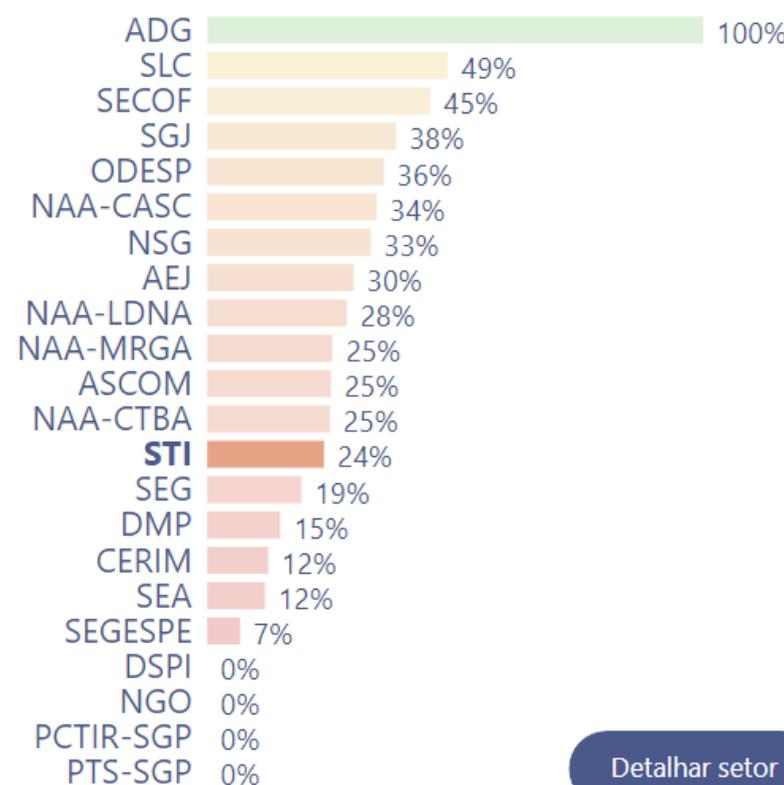

Detalhar setor

Código do Item	Descrição	Programação	Execução	Empenhado	% Executado	Grau de Execução	% Empenhado	Executado até o mês anterior	Programação até o mês anterior
151102022000118	INFRA-PJe - Solução de Backup (Suporte) - Biblioteca de fitas IBM - P...	R\$ 9.211,85	R\$ 9.222,00		100,11%	100,02%	246,26%	R\$ 46.069,4	R\$ 46.059,25
151102022000133	Sistema SIABI - Módulo Biblioteca e Memorial - (Manutenção, Atualiz...	R\$ 1.176,86	R\$ 1.177,00		100,01%	100,00%	240,00%	R\$ 5.884,44	R\$ 5.884,3
151102022000126	Internet dedicada - Link Primário - DINF	R\$ 4.226,71	R\$ 4.227,00		100,01%	100,00%	210,00%	R\$ 21.133,84	R\$ 21.133,55
151102022000130	GOVERNANÇA - Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte) - Ris...	R\$ 3.570,80	R\$ 3.571,00		100,01%	100,00%	256,73%	R\$ 17.370,24	R\$ 17.370,04
151102022000111	Suporte servidores HPE Gen9 - DINF	R\$ 6.166,66	R\$ 6.167,00		100,01%	100,00%	240,00%	R\$ 30.833,64	R\$ 30.833,3
151102022000139	SEGURANÇA - Solução de Filtragem de Correio Eletrônico (Suporte) (...	R\$ 7.043,71	R\$ 7.044,00		100,00%	100,00%	222,43%	R\$ 35.218,84	R\$ 35.218,55
151102022000134	Suporte Premier Microsoft - Soluções Microsoft - PR 28/2017 - CT 42...	R\$ 18.602,58	R\$ 18.603,00		100,00%	100,00%	129,50%	R\$ 86.192,45	R\$ 86.192,03
151102022000137	INFRA-PJe - Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte) - PC 18/...	R\$ 24.336,55	R\$ 24.337,00		100,00%	100,00%	240,00%	R\$ 121.683,2	R\$ 121.682,75
151102022000124	Manutenção flywheel (VM147 e 400)	R\$ 21.007,66	R\$ 21.008,00		100,00%	100,00%	271,53%	R\$ 92.840,64	R\$ 92.840,3
151102022000122	Suporte para Telefonia IP - Solução Asterisco Paraná - Celepar - PR 1...	R\$ 26.460,60	R\$ 26.461,00		100,00%	100,00%	240,00%	R\$ 132.303,4	R\$ 132.303
151102022000140	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - PR 11...	R\$ 105.662,70	R\$ 105.663,00		100,00%	100,00%	200,00%	R\$ 528.313,8	R\$ 528.313,5
151102022000120	Suporte Servidores de Banco de Dados - Oracle SPARC T5-8 - DINF	R\$ 23.895,98	R\$ 23.896,00		100,00%	100,43%	185,81%	R\$ 119.997,13	R\$ 119.479,9
151102022000125	Acesso móvel à Internet - DINF	R\$ 2.457,00	R\$ 2.457,00		100,00%	100,00%	243,24%	R\$ 11.730,19	R\$ 11.730,19
151102022000128	Internet dedicada - Link Secundário - DINF	R\$ 3.570,00	R\$ 3.570,00		100,00%	100,43%	251,03%	R\$ 17.926,03	R\$ 17.850
151102022000143	INFRA-PJe - Sistema Operacional (Suporte) - Servidor de Aplicação J...	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00		100,00%	100,00%	220,00%	R\$ 17.500	R\$ 17.500
151102022000150	Solução de Videoconferência para Audiências - DINF	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00		100,00%	100,00%	240,00%	R\$ 54.250	R\$ 54.250
151102022000121	INFRA-PJe - Serviços de Manutenção e Suporte das Soluções de Seg...	R\$ 50.419,01	R\$ 50.419,00		100,00%	100,00%	180,65%	R\$ 252.095,04	R\$ 252.095,05
151102022000109	Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Pesquisa e Aconsel...	R\$ 92.781,04	R\$ 92.781,00		100,00%	100,00%	207,62%	R\$ 463.905,16	R\$ 463.905,2
151102022000119	Suporte switches SAN - Comutador SAN Cisco MDS 9710 - PO 09/20...	R\$ 17.833,33	R\$ 17.833,00		100,00%	100,00%	220,17%	R\$ 105.053,88	R\$ 105.054,21
151102022000132	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - Supo...	R\$ 10.053,21	R\$ 10.053,00		100,00%	100,00%	140,00%	R\$ 50.265,84	R\$ 50.266,05
151102022000129	Uso de solo para passagem de fibra ótica URBS - PR 039/2008 - Term...	R\$ 4.188,45	R\$ 4.188,00		99,99%	100,00%	244,45%	R\$ 20.297,06	R\$ 20.297,51
151102022000116	Aquisição de Periféricos sem tombo (mouse, teclado, hd externo, caix...	R\$ 6.980,00	R\$ 6.890,00		98,71%	98,71%	554,30%	R\$ 6.890	R\$ 6.980
151102022000127	INFRA -Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz (multimídia) - R...	R\$ 75.010,00	R\$ 73.175,00		97,55%	97,59%	217,14%	R\$ 358.847,33	R\$ 367.710,88
151102022000146	INFRA - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte) - ...	R\$ 10.925,44	R\$ 7.872,00		72,05%	100,00%	344,48%	R\$ 39.360	R\$ 39.360
151102022000112	SEGURANÇA - Pen Test - Análise de Vulnerabilidades em Rede - Exter...	R\$ 11.508,00	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 0	R\$ 11.508
151102022000117	Solução de Service Desk - Central de Serviços de TIC - Serviços Tercei...	R\$ 183.256,61	R\$ 0,00		0,00%	78,76%	144,51%	R\$ 680.708,21	R\$ 864.334,48
151102022000123	INFRA-PJe - Manutenção em equipamentos de climatização de preci...	R\$ 6.640,43	R\$ 0,00		0,00%	79,01%	255,04%	R\$ 24.996,6	R\$ 31.637,03
151102022000148	Baterias UPS Eaton - Datacenter PMDC - DINF	R\$ 35.536,00	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0	R\$ 35.536
151102022000152	SEGURANÇA - Solução de Antivírus (Suporte) - Solução de seguranc...	R\$ 10.730,95	R\$ 0,00		0,00%	80,00%	240,00%	R\$ 42.923,8	R\$ 53.654,75
151102022000750	Equipamentos de áudio - DGSTI	R\$ 42.125,50	R\$ 0,00		0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 0	R\$ 42.125,5
151102022000110	Material de infraestrutura e ferramentas - DINF	R\$ 0,00	R\$ 0,00			100,00%	100,00%	R\$ 3.312,9	R\$ 3.312,9
151102022000113	Rede sem Fio (Wireless) - DINF	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
151102022000114	Manutenção de Nobreaks do Interior - DINF	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
151102022000115	Servidores rack - Controladores de Domínios - Gerencia Clusters Virt...	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
151102022000131	INFRA-PJe - Solução de Virtualização - PO-TI - DSIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
151102022000135	Soluções Microsoft - Aquisição/Renovação de suporte de softwares - ...	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
151102022000136	Suporte técnico, atualizações e correções do software Action Mixer (...	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
151102022000138	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - PO-TI...	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
151102022000141	INFRA-PJe - Sistema Operacional (Suporte) - Linux - PO-TI - DSIR	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 0	R\$ 0
Total		R\$ 829.727,63	R\$ 534.964,00		64,47%	91,90%	203,88%	R\$ 3.387.903,06	R\$ 3.686.418,22



R\$ 3.686.418,22
Orçamento

R\$ 3.387.903,06
Executado

R\$ 298.515,16
Saldo acumulado

R\$ 7.515.833,68
Empenhado

-R\$ 3.829.415,46
Saldo não Empenhado

91,90%
Grau de Execução


64,47%
% Executado

203,88%
% Empenhado

Execução Orçamentária



Programação e Execução Mensal

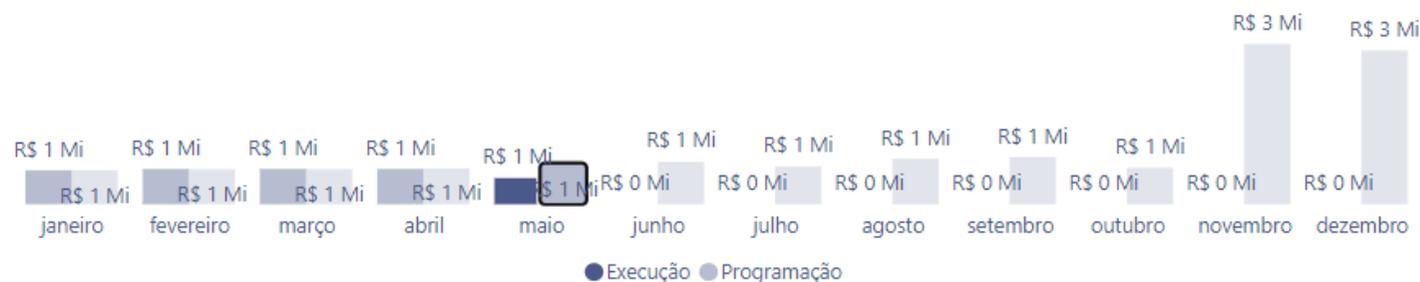

Detalhar item

Search

Código do Item	Descrição	Programação	Execução	Empenhado	% Executado	Grau de Execução	% Empenhado	Executado a
151102022000118	INFRA-PJe - Solução de Backup (Suporte) - Biblioteca de fitas IBM - P...	R\$ 9.211,85	R\$ 9.222,00		100,11%	100,02%	246,26%	
151102022000133	Sistema SIABI - Módulo Biblioteca e Memorial - (Manutenção, Atualiz...	R\$ 1.176,86	R\$ 1.177,00		100,01%	100,00%	240,00%	
151102022000126	Internet dedicada - Link Primário - DINF	R\$ 4.226,71	R\$ 4.227,00		100,01%	100,00%	210,00%	
151102022000130	GOVERNANÇA - Solução de Gerenciamento de Riscos (Suporte) - Ris...	R\$ 3.570,80	R\$ 3.571,00		100,01%	100,00%	256,73%	
151102022000111	Suporte servidores HPE Gen9 - DINF	R\$ 6.166,66	R\$ 6.167,00		100,01%	100,00%	240,00%	
151102022000139	SEGURANÇA - Solução de Filtragem de Correio Eletrônico (Suporte) (...	R\$ 7.043,71	R\$ 7.044,00		100,00%	100,00%	222,43%	
151102022000134	Suporte Premier Microsoft - Soluções Microsoft - PR 28/2017 - CT 42...	R\$ 18.602,58	R\$ 18.603,00		100,00%	100,00%	129,50%	
151102022000137	INFRA-PJe - Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte) - PC 18/...	R\$ 24.336,55	R\$ 24.337,00		100,00%	100,00%	240,00%	
151102022000124	Manutenção flywheel (VM147 e 400)	R\$ 21.007,66	R\$ 21.008,00		100,00%	100,00%	271,53%	
Total		R\$ 829.727,63	R\$ 534.964,00		64,47%	91,90%	203,88%	

Situação Plano Anual de Capacitação STI 2022 - Capacitações Autorizadas

Próximas Capacitações a Contratar

Ação de Capacitação	Vagas	Valor autorizado	Data do Evento	Previsão início contratação (30 dias antes da execução)
Transformação Digital: Tecnologias e suas Aplicações Práticas	1	R\$ 9.780,10	27/09/2022	28/08/2022
CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA	6	R\$ 900,00	08/07/2022	08/06/2022
ANÁLISE FORENSE - SEGURANÇA (EAD)	9	R\$ 11.700,00	15/08/2022	16/07/2022
Segurança da informação e Privacidade de Dados Pessoais	9	R\$ 7.650,00	18/07/2022	18/06/2022
Total		R\$ 30.030,10		

Capacitações Autorizadas

9
Quantidade
R\$ 157.369,30
Valor planejado

Capacitações a contratar

5
Quantidade
R\$ 41.482,10
Valor planejado


Capacitações contratadas ou ...

4
Quantidade
R\$ 115.887,20
Valor planejado


Capacitações Executadas

2
Quantidade
R\$ 84.720,00
Valor contratado

Qtd. de capacitações a contratar por mês

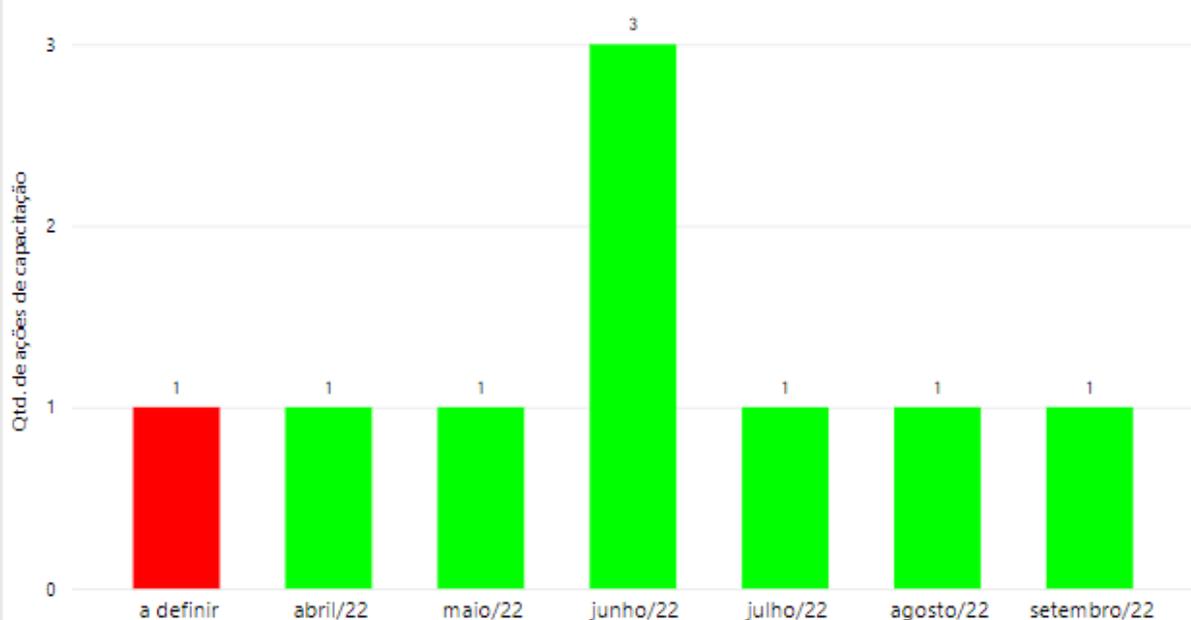



Qtd. de capacitações executadas por mês

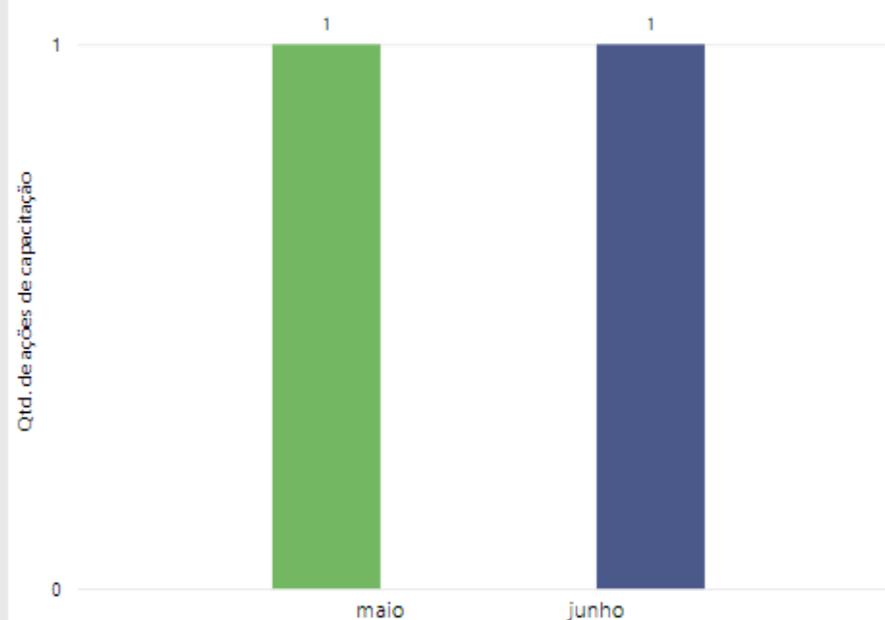

Situação Plano Anual de Capacitação STI 2022 - Capacitações Autorizadas Analítico

Capacitações a contratar		Capacitações contratadas ou em processo		Capacitações Executadas	
5	R\$ 41.482,10	4	R\$ 115.887,20	2	R\$ 84.720,00
Quantidade	Valor planejado	Quantidade	Valor planejado	Quantidade	Valor contratado


Ação de Capacitação	Vagas	Valor autorizado	Data do Evento	Mês início da contratação	Iniciou contratação?	Processo	Valor contratado	Diferença (Planejado x Contratado)	Executado ? (S/N)	Executado em
ANÁLISE FORENSE -SEGURANÇA (EAD)	9	R\$ 11.700,00	15/08/2022	7/2022	N				N	
CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA	6	R\$ 900,00	08/07/2022	6/2022	N	MEM STI 166/2022			N	
Design for Data Privacy	3	R\$ 4.317,00	11/07/2022	6/2022	S	MEM STI 168/2022		R\$ 4.077,45	N	
Evento Agile Brazil 2022 - Métodos de Desenvolvimento de Software	3	R\$ 21.570,20	05/10/2022	9/2022	S	MEM STI 165/2022			N	
MySQL Database Administration	2	R\$ 11.452,00		A definir	N				N	
Segurança da informação e Privacidade de Dados Pessoais	9	R\$ 7.650,00	18/07/2022	6/2022	N				N	
Transformação Digital: Tecnologias e suas Aplicações Práticas	1	R\$ 9.780,10	27/09/2022	8/2022	N				N	
VMware vSphere: Install, Configure, Manage (V7.0)	6	R\$ 34.800,00	09/05/2022	4/2022	S	280160	R\$ 34.800,00	R\$ 0,00	S	13/05/2022
VMware vSphere: Optimize and Scale	6	R\$ 55.200,00	06/05/2022	5/2022	S	280712	R\$ 40.000,00	R\$ 15.200,00	S	10/05/2022
Total		R\$ 157.369,30					R\$ 84.720,00	R\$ 9.357,45		

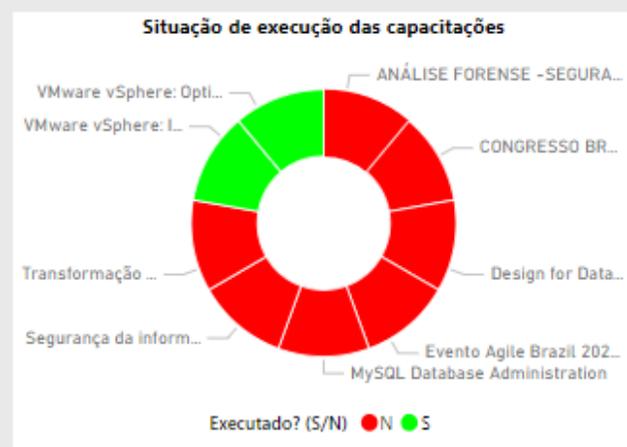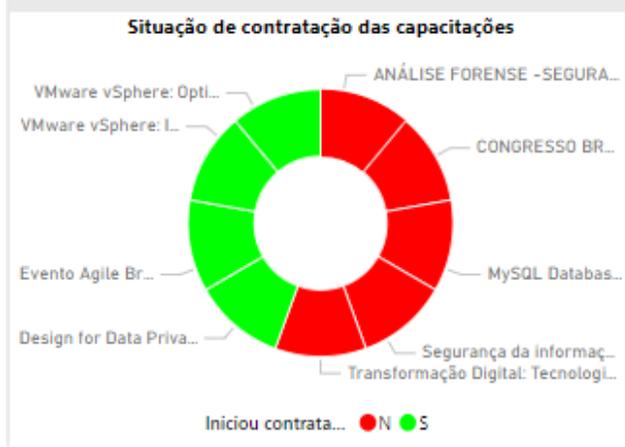

Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização
2022


Cursos Finalizados por Time e Mês

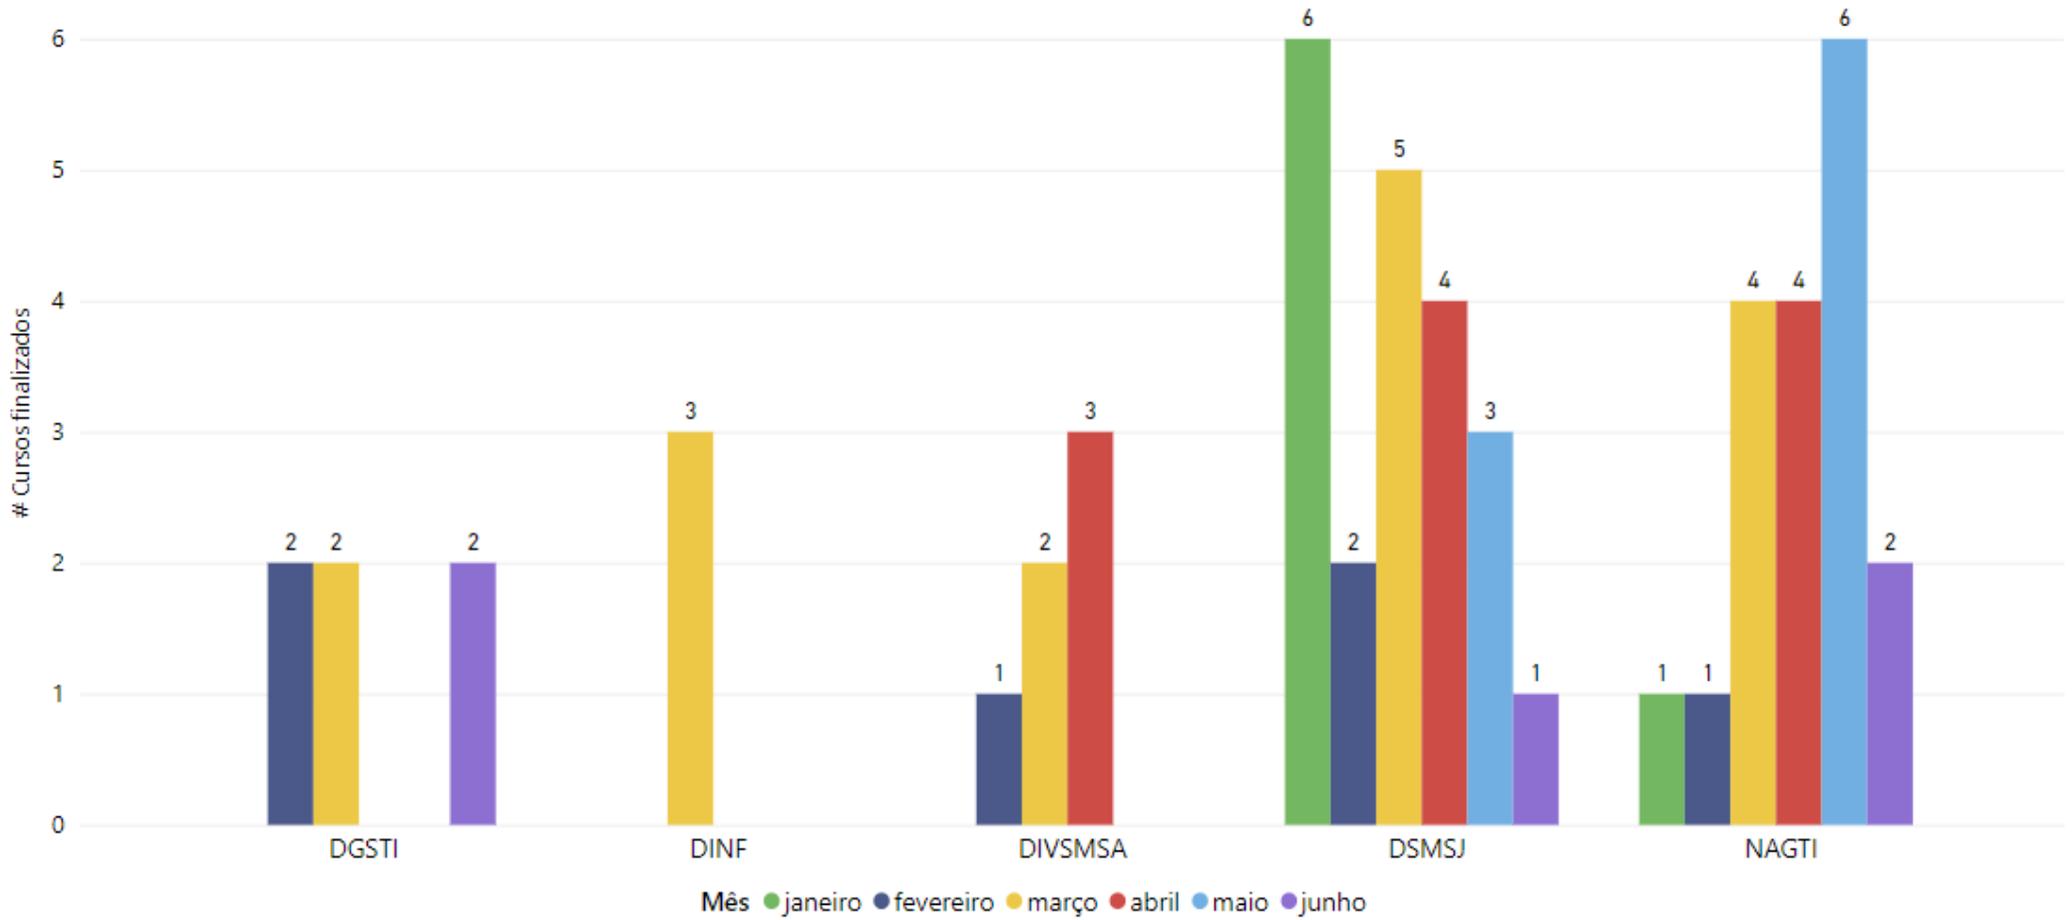


Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização

2022




Cursos Finalizados por Time

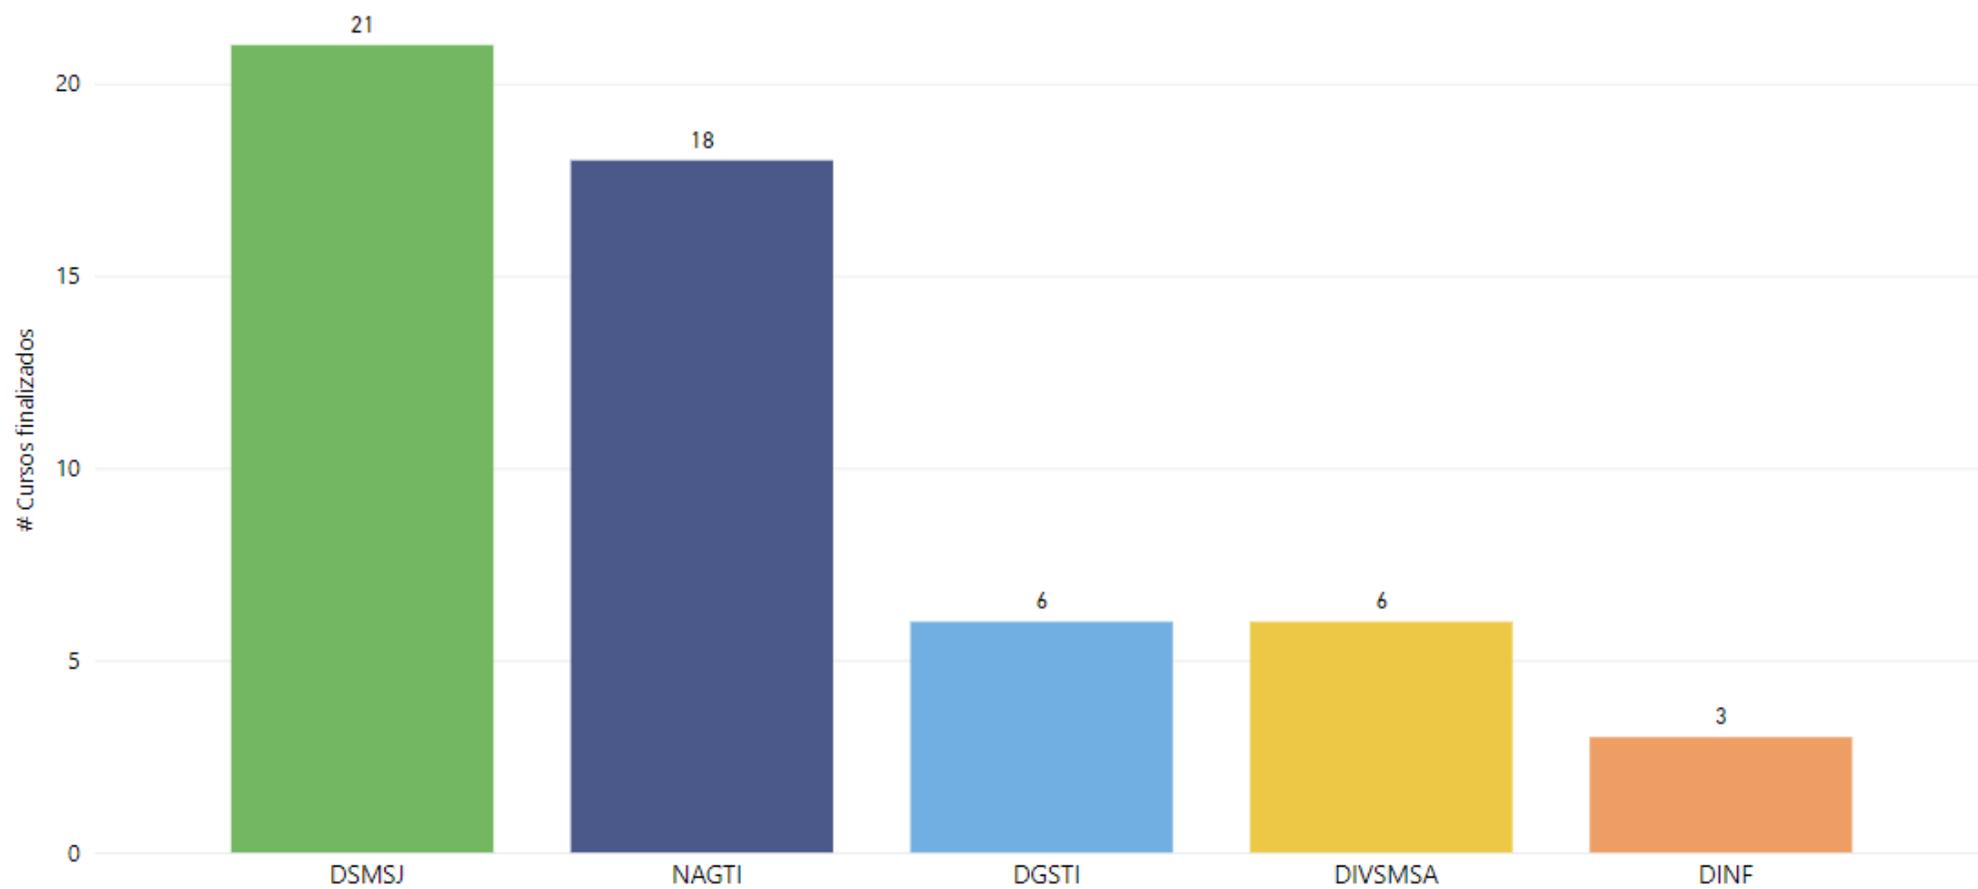

Total	Não iniciado	Sem Gerente	Sem PO
40	3	1	21

STATUS ● Em execução ● Em planeja... ● Não iniciado ● (Blank) ▶



Unidade Organizacional

All

Status

Multiple selections

Programa

All

Product Owner

All

Gerente de Projeto

All

Projetos

Link	Nome da demanda	Status	Pri...	Gerente	Início Prev...	Fim Previsto	Pri...	Product O...
🔗	Projeto Plano de Transformação Digit...	Não iniciado	28...	Jaime De Britto	01/02/23	30/12/24	28...	
🔗	Ação de Acompanhamento do Plano ...	Em execução		Walter Ribeiro De Oliveira Junior	01/03/22	01/09/22		
🔗	Acompanhamento Prova de Conceito ...	Em execução		Walter Ribeiro De Oliveira Junior	04/07/22	31/10/22		Daniel Vi
🔗	Adaptação dos sistemas judiciários e ...	Em execução		Alexandre Luiz Boruschenko Moro	15/03/22	30/06/22		
🔗	Ativação de autenticação dos Hosts e...	Não iniciado		Robson Cleiton Novak				
🔗	Ativação do IPS - Intrusion Prevent Sys...	Não iniciado		Robson Cleiton Novak	15/09/20	12/03/21		
🔗	Automação e Melhorias na Análise no ...		0.72	Wellington Luiz Gaboardi			0.72	
🔗	Automatização de fluxos do PJe na Víc...		0.71				0.71	
🔗	Colaboração Externa (Res. CNJ 370 / ...	Em planejam...	28...	Jaime De Britto	04/04/22	30/12/22	28...	
🔗	Consulta de dados pessoais pelos titu...	Em execução	28...	Mike Wesley Blunk	19/10/21	31/08/22	28...	Daniel Ar
🔗	Criar acordos de níveis de serviços pa...	Em execução		Konrad Alexander Sauer Duarte	05/10/20	18/12/20		

Escopo

Item

- Versão pública do Sistema de PUJ (Pesquisa Unificada de Jurisprudência)
- Versão Interna do Sistema de Pesquisa Unificada de Jurisprudência
- Uso controlado de privilégios administrativo
- Tela de audiências por advogado
- Suprimento de Fundos - migração para o Vêtor
- SUPRIMENTO DE FUNDOS

Processos por Unidade Organizacional

STATUS ● (Blank) ● Em encerramento ● Em execução ● Em homologação ● Em planejamento ● Não iniciado

