



# PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região



RICARDO  
ERBANO 10  
/12/2024  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 19  
/12/2024  
SGTIC TRT9

## Vetor: Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)

### Ata/Pauta - 27.11.2024 - 22ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2024 (ID 10535536)

#### Agendamento (ID 10535537)

**Data:** 27/11/2024

**Horário:** 14:00 até 15:00

**Reunião Extraordinária:** Não

**Convidados:**

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO - COORDENADOR - COORDENADORIA DE APOIO TÁTICO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE APOIO À GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES DE AUDIÊNCIAS E JULGAMENTO

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC

OMAR CARVALHO - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

IZAIAS CATELLI DE CARVALHO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE - CHEFE DE SEÇÃO - SEÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES AO PJE

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -



COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR -  
 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA  
 DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -  
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DIRETOR DE SECRETARIA -  
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA  
 GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO -  
 SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES  
 PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR -  
 COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES -  
 COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E  
 REDES

**Local da reunião:** Telepresencial

**Participantes:**

Bruno Guedes Moreira  
 Celimar Lucia Gobetti  
 Claucio Jorge De Lima  
 Clemerson Keiber  
 Daniel Adriano Pinto Da Silva  
 Daniel Vicente Thomaz  
 Eduardo Silveira Rocha  
 Hugo Signoretti Netto  
 Luis Guilherme Baptista Cordeiro  
 Luiz Fernando Klahold  
 Omar Carvalho  
 Paulo Roberto Nunes  
 Ramon Pereira Molossi  
 Ricardo Erbano  
 Valentino Pavelizky  
 Walter Ribeiro De Oliveira Junior  
 Wellington Luiz Gaboardi

  
 RICARDO  
 ERBANO 10  
 /12/2024  
 CGTIC TRT9  
  
 EDUARDO  
 SILVEIRA  
 ROCHA 19  
 /12/2024  
 SGTIC TRT9

**Link da reunião gravada:** <https://drive.google.com/file/d/19DfVQPy1S5LtJRcUq7qvJwYvCYsHkc1a/view>

**Itens da reunião (ID 10535545)**

**Apresentação/acompanhamento orçamento da TI (ID 10535546)**

**Nome do item:** Apresentação/acompanhamento orçamento da TI.

**Descrição:**

Luiz Fernando Klahold apresentou a planilha de acompanhamento com o plano anual de contratações de 2024 (PCA) com os dados atualizados até a data da presente reunião.



Informou que o orçamento está quase todo empenhado e que foi feito um levantamento das sobras orçamentárias, tendo sido identificadas, atribuídas e remanejadas para os itens de aquisição de bateria de no-break e de periféricos.

A execução orçamentária da TI está com 71%, em razão dos itens de grande valor que ainda não foram executados e, consequentemente, não atualizados na SECOF.

O plano de contratações de 2025 já foi aprovado e no PROAD 7355/24 foi encaminhada à DG a proposta orçamentário prévia para 2026, em que houve a necessidade de adequação ao limite de R\$ 16.161.000,00. Foi registrado no mesmo processo uma lista de 11 itens que não couberam no orçamento, indicando uma priorização baseada nos riscos para a prestação jurisdicional no caso da não execução orçamentária do item.

  
RICARDO  
ERBANO 10  
/12/2024  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 19  
/12/2024  
SGTIC TRT9

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Luiz Fernando Klahold atualizar planilha de acompanhamento com as informações passadas pelos responsáveis de cada contratação e programar os itens que devem ser novamente revistos nas próximas reuniões do comitê STIC.

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

### **Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 12951864)**

**Nome do item:** Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

#### **Descrição:**

Wellington Luiz Gaboardi apresentou o andamento dos atuais projetos de TI no painel de acompanhamento de projetos:

(<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP>).

Informa que houve o cadastro de mais quatro demandas no final de novembro: Elaboração de Painel Power BI de indicadores de TIC, Sistematização do controle de horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso, Manutenção evolutiva do vetor e Estruturação do ambiente de monitoramento do parque de impressoras.



Demonstrou na planilha um resumo das últimas atualizações referentes à execução dos projetos.

O sistema de assistente do Recurso de Revista foi feita uma apresentação para Desembargadores e eles autorizaram a apresentação para alguns escritórios em Curitiba.

Não houve alteração no número de projetos concluídos desde a última reunião, sendo 21 projetos concluídos, e outros 3 estão em fase de encerramento.



### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Wellington agendar uma apresentação do projeto Assistente de Recurso de Revista para o Eduardo Rocha e Daniel Thomaz antes da apresentação para escritórios de advocacia.

Wellington Luiz Gaboardi programar os itens que devem ser novamente revistos para a última reunião do ano do Comitê STIC.

**anexo:** [Download: STIC 27\\_11\\_2024 \\_projetos.pdf](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

### **Aprovação PDTIC 2025 (ID 12951871)**

**Nome do item:** Aprovação PDTIC 2025.

#### **Descrição:**

Ricardo Erbano iniciou apresentação informando que o Plano Diretor de TIC é uma determinação da Resolução 370/2021 do CNJ, sendo um documento muito importante nos requisitos de avaliação do Tribunal perante os Órgãos de Conselho.

Apresentou as partes que compõem o Plano referente a 2025, sua finalidade, a estrutura do documento, bem como apresentou um resumo de cada um dos itens: Resumo da pesquisa de satisfação com a informática; Análise do pessoal de TIC; Plano anual de capacitação de TIC; Conjunto das ações planejadas para ser executadas no período, com seus respectivos cronogramas; Plano orçamentário, com a previsão das despesas e investimentos e as fontes de recursos; Plano de contratações, com o custo das ações e de manutenção dos serviços disponibilizados pela TI; Matriz de alinhamento estratégico e Indicadores de resultado e metas.



Eduardo Silveira Rocha agradeceu e elogiou o trabalho conjunto feito na área de governança e gestão da TI, cujos resultados têm sido excelentes e reconhecidos nacionalmente.

Paulo sugeriu acrescentar ao PDTIC o Plano de Segurança da Informação 2024 /2025, que atende à Resolução CNJ 396/2021.

O PDTIC foi aprovado por todos os integrantes do Comitê.

  
RICARDO  
ERBANO 10  
/12/2024  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 19  
/12/2024  
SGTIC TRT9

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Ricardo Ervano acrescentar informação sobre o Plano de Segurança da Informação como parte integrante do PDTIC.

**Monitoramento PDTIC?:** Sim



STIC- Videoconferência realizada no dia 27/11/2024

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Painel de Demandas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Demandas

Atualizado em 27/11/2024 13:30

Total

14

Para Aprovação

13

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº370 (ENTIC-JUD)

Escritório de Projetos

STI

Demandas

| Link                                                                                | Nome da Demanda                                                                               | Prioridade Demanda | Data Cadastro                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Projeto Avaliação da adoção de arquitetura e plataforma em nuvem (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)    | 0,42               |  29/07/2021 |
|    | Ferramenta de Comunicação com Aposentados                                                     |                    |  13/03/2023 |
|    | Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados                                       | 0,44               |  10/11/2023 |
|    | Sistema de Controle de Acesso - Secretaria de Segurança Institucional                         | 0,44               | 13/06/2024                                                                                     |
|    | Ambiente Virtual de EAD para a Secretaria de Segurança Institucional                          | 0,33               | 29/07/2024                                                                                     |
|    | Sistema complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1º Grau                     | 0,82               | 29/07/2024                                                                                     |
|    | Site Institucional para Programas e Grupos Nacionais                                          | 0,33               | 29/07/2024                                                                                     |
|    | Pesquisa de Jurisprudência Própria                                                            | 0,64               | 19/09/2024                                                                                     |
|    | Controle de Sucessões                                                                         | 0,54               | 23/10/2024                                                                                     |
|    | PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial                                                   | 0,62               | 23/10/2024                                                                                     |
|   | Sistema Informatizado de Controle de Perícias e Juntas Médicas                                | 0,71               | 23/10/2024                                                                                     |
|  | Elaboração de painel Powerbi de indicadores de TIC                                            |                    | 18/11/2024                                                                                     |
|  | Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em r... |                    | 18/11/2024                                                                                     |
|  | Manutenção evolutiva do Vetor (versões, robôs e modelagem)                                    |                    | 26/11/2024                                                                                     |

Meta

Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas

Previsto na Demanda

0,22

Atualizado em 27/11/2024 13:30

Programas

| Total | Projetos | Metas | Metas sem Previsão em Projeto | Metas sem Planejamento | Metas sem Tarefas | Metas Atendidas |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 6     | 129      | 15    | 6                             | 9                      |                   |                 |

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Programas

|        |                                                  |  |     |
|--------|--------------------------------------------------|--|-----|
| Editar | Programas                                        |  | Dei |
|        | Programa Aceleração Digital                      |  | Sei |
|        | Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...    |  | Sei |
|        | Programa de Governança em Privacidade            |  | Sei |
|        | Programa Sistematização e organização dos at...  |  | An  |
|        | Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)                   |  | An  |
|        | Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do... |  | Bri |

Metas

| Meta                                                                               | Data para cumprir | Previsto em projeto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                                 | 31/12/21          | 1,17                |
| Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados                | 31/12/21          | 1,00                |
| Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ... | 29/07/22          | 1,00                |
| Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...  | 16/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação                                     | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações                                  | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas         | 31/12/22          | 0,67                |
| Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                        | 31/12/22          | 0,17                |
| Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa      | 30/11/23          | 0,00                |
| Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...   | 30/11/23          | 0,07                |
| Número de serviços digitalizados para o cidadão                                    | 30/11/23          | 43,33               |


Projetos

Editar

Nome do Projeto

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362                                                |
|  | 256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)                                          |
|  | 256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação                                |
|  | 306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos                                                         |
|  | 289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos                                                          |
|  | 255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPI) e Res. CNJ 37 |
|  | 255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)                       |
|  | 256415 - Projeto Acomps: melhorias na Tela de Sessão e Sustentação Oral (EML 7 TURMA 014/2021)                   |

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Projetos

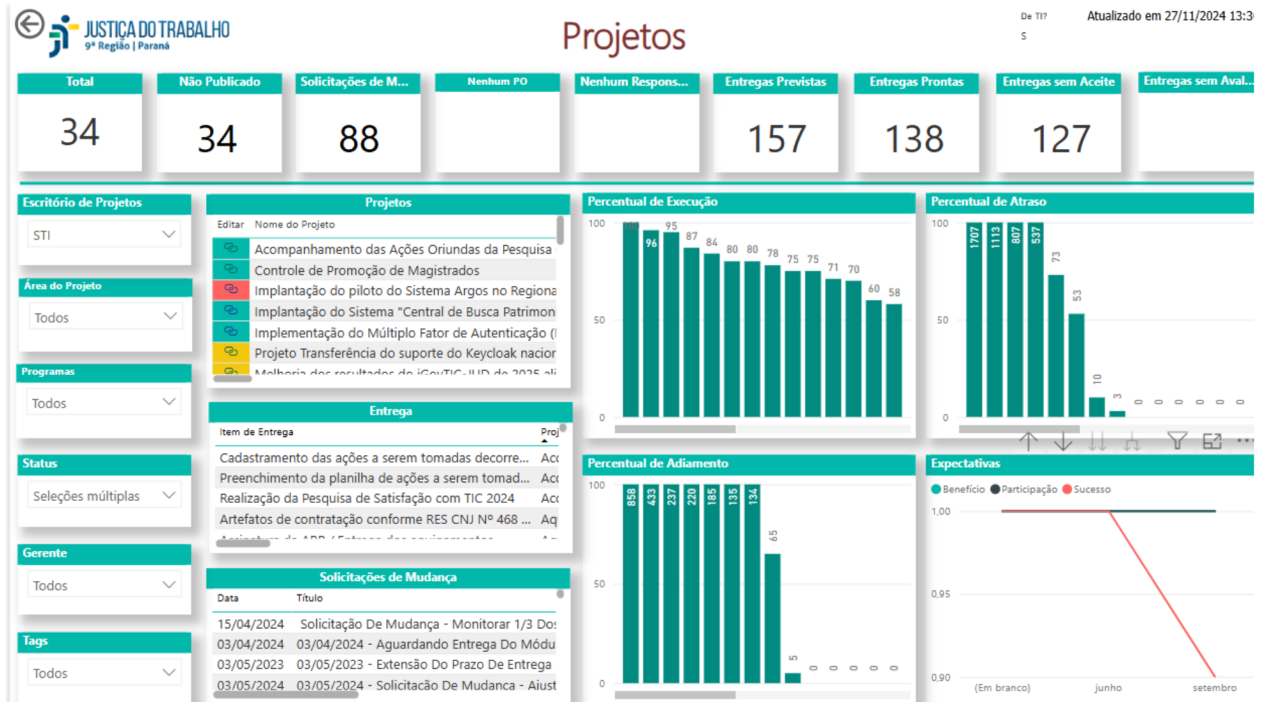

| Editar | Nome do Projeto                                                                                         | Status          | Gerente | Product Owner | Responsável pelo Resultado | Prioridade | Demanda | % Execução | % Atraso | % |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|----------------------------|------------|---------|------------|----------|---|
| 13     | Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Interna e Externa dos Usuários com TIC 2024 | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 33      | 0          |          |   |
| 13     | Controle de Promoção de Magistrados                                                                     | Em execução     |         |               |                            | 0,95       | 50      | 0          |          |   |
| 13     | Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional                                                      | Em execução     |         |               |                            | 0,74       | 75      | 10         |          |   |
| 13     | Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEF (TRT18)                            | Em execução     |         |               |                            | 0,70       | 50      | 3          |          |   |
| 13     | Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9                                           | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 80      | 0          |          |   |
| 13     | Projeto Transferência do suporte do Keycloak nacional (Sigee) do TRT-22 para o TRT9                     | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 44      | 537        |          |   |
| 13     | Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)     | Em planejamento |         |               |                            | 0,65       | 0       | 0          |          |   |
| 13     | Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL                        | Em execução     |         |               |                            | 0,48       | 33      | 0          |          |   |
| 13     | Desativação do Office                                                                                   | Suspensão       |         |               |                            | 1,00       | 71      | 1113       |          |   |
| 13     | Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9                                                        | Em execução     |         |               |                            | 0,44       | 84      | 0          |          |   |
| 13     | Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eleitoral                                                   | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 96      | 0          |          |   |
| 13     | Nacionalização do sistema Solária do TRT9                                                               | Em execução     |         |               |                            | 0,64       | 78      | 0          |          |   |
| 13     | Projeto Nacionalização do sistema Falcão                                                                | Em execução     |         |               |                            | 0,69       | 4       | 0          |          |   |
| 13     | Relatórios de Precatórios                                                                               | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 50      | 0          |          |   |
| 13     | RJ-22 - Identificador AJ/IT                                                                             | Suspensão       |         |               |                            | 0,71       | 0       | 0          |          |   |
| 13     | RJ-23 - Registro no Pile a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente                     | Suspensão       |         |               |                            | 0,50       | 0       | 0          |          |   |
| 13     | RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no Pile                                               | Em execução     |         |               |                            | 0,59       | 0       | 0          |          |   |
| 13     | RJ-27 - Certifica a alteração de status de requisição de pagamento no sistema AJ/IT                     | Suspensão       |         |               |                            | 0,59       | 0       | 0          |          |   |
| 13     | Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)                                                          | Em execução     |         |               |                            | 0,56       | 0       | 0          |          |   |
| 13     | Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte                                               | Em execução     |         |               |                            | 0,37       | 25      | 73         |          |   |
| 13     | Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)                                                       | Em execução     |         |               |                            | 0,66       | 80      | 0          |          |   |
| 13     | Nacionalização do modelo de colegiados temáticos do vetor                                               | Suspensão       |         |               |                            | 1,00       | 0       | 1707       |          |   |
| 13     | Processo de contratações de TI via Vetor com integração ao PROAD                                        | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 87      | 0          |          |   |
| 13     | Reforma da Sala de Sonorização do RB528                                                                 | Em execução     |         |               |                            | 0,49       | 0       | 53         |          |   |
| 13     | Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI                       | Em execução     |         |               |                            | 0,46       | 60      | 0          |          |   |
| 13     | Sistematização de atos normativos                                                                       | Em execução     |         |               |                            | 0,54       | 75      | 0          |          |   |
| 13     | Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização                                    | Em execução     |         |               |                            | 0,47       | 20      | 0          |          |   |
| 13     | Aquisição switches SAN - Descentralização                                                               | Em execução     |         |               |                            | 0,47       | 20      | 0          |          |   |
| 13     | Criação automatizada de ementas                                                                         | Em execução     |         |               |                            | 0,61       | 40      | 0          |          |   |
| 13     | Evolução do e-Rec Internalização                                                                        | Em execução     |         |               |                            | 0,77       | 95      | 0          |          |   |
| 13     | Pile - eCarta Nacional (CSJT)                                                                           | Em execução     |         |               |                            | 0,77       | 58      | 807        |          |   |
| 13     | Pile Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos                                                   | Em execução     |         |               |                            | 0,39       | 100     | 0          |          |   |
| 13     | Pile-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista                                              | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 70      | 0          |          |   |
| 13     | Pressupostos Intrínsecos com IA                                                                         | Em execução     |         |               |                            | 1,00       | 0       | 0          |          |   |

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Setembro/2024

| Voltar ao relatório                                       |                      |                     |                                                   |                         |                        |                   |                                                                   |      |            |      |                   |                     |                |                  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| ENTREGA                                                   |                      |                     |                                                   |                         |                        |                   |                                                                   |      |            |      |                   |                     |                |                  |  |
| Colar Item da Entrega                                     | Fin Previsto Entrega | Fin Efetivo Entrega | Projeto                                           | Inicio Previsto Entrega | Inicio Efetivo Entrega | Status do Projeto | Área do Projeto                                                   | Link | Prioridade | Peso | Status da Entrega | Entrega em Produção | Entrega Acerta | Entrega Avaliada |  |
| Módulo de Equipamentos                                    | 30/09/2024           | 17/10/2024          | Controle de Recursos - Segurança Patrimonial      | 27/03/2023              | 27/03/2023             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Permitir que o próprio advogado possa cancelar e a...     | 27/09/2024           | 03/09/2024          | Acomp - Acompanhamento das ações de ma...         | 20/03/2024              | 20/03/2024             | Concluído         | Secretaria Geral Judiciária                                       | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |  |
| Automatizador de aposição de selo histórico               | 30/09/2024           | 17/09/2024          | Automação de Aposição de Selo Histórico em ...    | 22/04/2024              | 22/04/2024             | Em encerramento   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 1          | 95   | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Robô de automação de precatórios                          | 30/09/2024           | 26/09/2024          | RJ-25 Automação de Precatórios para comuni...     | 27/05/2024              | 27/05/2024             | Em encerramento   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Alteração do sistema para implementação da Dispo...       | 27/09/2024           | 03/09/2024          | Acomp - Acompanhamento das ações de ma...         | 20/06/2024              | 20/06/2024             | Concluído         | Secretaria Geral Judiciária                                       | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |  |
| Nova homologação do sistema para a versão 1.3.5.2         | 27/09/2024           | 27/09/2024          | Implantação do piloto do Sistema Argos no R...    | 08/07/2024              | 08/07/2024             | Em execução       | Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações       | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |  |
| Formulários de inscrição e relatórios de inscrições (...) | 25/09/2024           | 24/09/2024          | Indicação de Reconhecimento do TRT9 - vers...     | 15/07/2024              | 15/07/2024             | Concluído         | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 🔗    | 1          | 40   | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Acompanhamento de uso do sistema e correções d...         | 27/09/2024           | 04/10/2024          | Melhoria do Sistema de Registro de Esforço        | 12/08/2024              | 12/08/2024             | Concluído         | Coordenadoria de Gestão de Tlc                                    | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Análise dos pedidos de melhoria                           | 27/09/2024           | 20/09/2024          | Melhoria do Sistema de Registro de Esforço        | 12/08/2024              | 12/08/2024             | Concluído         | Coordenadoria de Gestão de Tlc                                    | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Configuração do ambiente de produção e migração...        | 08/09/2024           | 06/09/2024          | Binário Protegido - Salvaguarda e Migração d...   | 29/08/2024              | 29/08/2024             | Concluído         | Núcleo de Gestão da Segurança da Informação                       | 🔗    | 5          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Implantação módulo no ambiente de produção co...          | 06/09/2024           | 06/09/2024          | Pie Binários - Armazenamento em sistemas de...    | 29/08/2024              | 29/08/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 6          | 2    | Concluído         | Sim                 | Sim            | Não              |  |
| Estudo sobre o uso de controle de parcelamento d...       | 13/09/2024           | 13/09/2024          | Relatório de Precatórios                          | 02/09/2024              | 02/09/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 4          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |  |
| RJ13 adaptado para ler sentenças                          | 30/09/2024           | 23/09/2024          | Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio EL... | 02/09/2024              | 02/09/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 11         | 20   | Concluído         | Sim                 | Sim            | Não              |  |
| Interromper gravação dos Binários na base BIN do ...      | 08/09/2024           | 07/09/2024          | Pie Binários - Armazenamento em sistemas de...    | 07/09/2024              | 07/09/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Sim            | Não              |  |
| Elaboração dos artefatos da contratação                   | 19/09/2024           | 19/09/2024          | Aquisição switches SAN - Descentralização         | 19/09/2024              | 19/09/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Infraestrutura                                   | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |  |
| Liberação de acesso ao GIT com os VAMLS do Keycl...       | 27/09/2024           | 27/09/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...  | 26/09/2024              | 26/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Liberação de acesso ao Kibana/Dashboard com as l...       | 30/09/2024           | 30/09/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...  | 26/09/2024              | 26/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Liberação de acesso ao Registry do Keycloak               | 30/09/2024           | 30/09/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...  | 26/09/2024              | 26/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |
| Definir a forma de comunicação de atualizações Key...     | 30/09/2024           | 30/09/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...  | 30/09/2024              | 30/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |  |

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Outubro/2024

< Voltar ao relatório

ENTREGA

| Editar | Item de Entrega                                           | Fin Previsto Entrega | Fin Efetivo Entrega | Projeto                                          | Início Previsto Entrega | Início Efetivo Entrega | Status do Projeto | Área do Projeto                                                   | Link | Prioridade | Peso | Status da Entrega | Entrega em Produção | Entrega Aceita | Entrega Avaliada |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 100    | Criação Projeto Jira TST para atendimento ao Keycloak ... | 01/10/2024           | 01/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 30/09/2024              | 30/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Mapar alternativa de localização do acionamento ...       | 04/10/2024           | 03/10/2024          | Sistema de acionamento emergencial de equi...    | 30/09/2024              | 01/10/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Atividades de encerramento                                | 08/10/2024           | 08/10/2024          | Melhoria do Sistema de Registro de Esforço       | 07/10/2024              | 07/10/2024             | Concluído         | Coordenadoria de Gestão de Tics                                   | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |
| 100    | Documentação básica do sistema                            | 11/10/2024           | 09/10/2024          | Automação de Aposição de Selo Histórico em ...   | 25/06/2024              | 25/06/2024             | Em encerramento   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 2          | 5    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Criação de usuário para o TRT9 para gestão das ima...     | 16/10/2024           | 16/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 26/09/2024              | 26/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Disponibilizar acesso aos ambientes de administraç...     | 17/10/2024           | 17/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 16/10/2024              | 16/10/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Testes em conjunto de atualização / configuração d...     | 17/10/2024           | 17/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 30/09/2024              | 30/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Liberação de acesso ao Kubernetes para o TRT9             | 18/10/2024           | 17/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 26/09/2024              | 26/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Realização da Pesquisa de Satisfação com TIC 2024         | 18/10/2024           | 10/10/2024          | Acompanhamento das Ações Oriundas da Pes...      | 08/05/2024              | 08/05/2024             | Em execução       | Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações       | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |
| 100    | Tela de avaliação das inscrições pela banca e relato...   | 18/10/2024           | 18/10/2024          | Indicação de Reconhecimento do TRT9 - versã...   | 26/09/2024              | 25/09/2024             | Concluído         | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 🔗    | 1          | 60   | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Testes em conjunto de atualização / configuração d...     | 21/10/2024           | 21/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 30/09/2024              | 30/09/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Homologação e encerramento do projeto                     | 25/10/2024           | 25/10/2024          | Indicação de Reconhecimento do TRT9 - versã...   | 21/10/2024              | 21/10/2024             | Concluído         | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |
| 100    | Item de entrega Implantação do Portal                     | 25/10/2024           | 28/10/2024          | Novo Portal da Intranet                          | 03/06/2024              | 03/06/2024             | Em encerramento   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 🔗    | 4          | 15   | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Monitoramento do e-Carta (versão 2.1.12.2)                | 25/10/2024           | 12/11/2024          | Ple - eCarta Nacional (CSST)                     | 08/09/2024              | 08/09/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 7          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Testes em conjunto de atualização / configuração d...     | 25/10/2024           | 25/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 07/10/2024              | 07/10/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Não Iniciado      | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Verificar as bibliotecas (mappers, extensions, templ...   | 25/10/2024           | 25/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 21/10/2024              | 18/10/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Criação de uma base de conhecimento (wiki) com l...       | 30/10/2024           | 18/10/2024          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 20/10/2024              | 16/10/2024             | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 🔗    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Módulo de Seniores                                        | 30/10/2024           | 30/10/2024          | Control de Recursos - Segurança Patrimonial      | 20/11/2023              | 20/11/2023             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 🔗    | 1          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Planejamento da reforma                                   | 30/10/2024           | 30/10/2024          | Reforma da Sala de Sonorização do RE328          | 20/09/2024              | 20/09/2024             | Em execução       | Divisão de Suporte Técnico A Audiências e Eventos                 | 🔗    | 2          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 100    | Acompanhamento e orientação aos usuários                  | 31/10/2024           | 31/10/2024          | Implantação do Sistema "Central de Busca Pat...  | 13/11/2023              | 24/06/2024             | Em execução       | Laboratório de Inovação                                           | 🔗    | 1          | 1    | Em Andamento      | Não                 | Não            | Não              |
| 100    | Envio para o Ple e assinatura digital do RR com ane...    | 31/10/2024           | 09/11/2024          | Ple-AssusPR - Assistente de Edição de Recurs...  | 02/10/2024              | 02/10/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários     | 🔗    | 6          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Novembro/2024

| ENTREGA             |                                                      |                       |                       |                                                  |                         |                         |                   |                                                                   |    |      |            |      |                   |                     |                |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----|------|------------|------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Voltar ao relatório |                                                      |                       |                       |                                                  |                         |                         |                   |                                                                   |    |      |            |      |                   |                     |                |                  |
|                     |                                                      | Fin. Previsto Entrega | Fin. Objetivo Entrega | Projeto                                          | Início Previsto Entrega | Início Objetivo Entrega | Status do Projeto | Área do Projeto                                                   |    | Link | Prioridade | Peso | Status da Entrega | Entrega em Produção | Entrega Aceita | Entrega Avaliada |
| 10                  | Implantar a versão KC 25 em ambiente de desenvol...  | 05/11/2024            |                       | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 05/11/2024              |                         | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 10 | 1    | 1          | 1    | Não Iniciado      | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Construção das melhorias aprovadas.                  | 08/11/2024            | 04/10/2024            | Melhoria do Sistema de Registro de Esforço       | 30/09/2024              | 23/09/2024              | Concluído         | Coordenadoria de Gestão de Tics                                   | 10 | 1    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Implantar a versão KC 25 em ambiente de homolog...   | 12/11/2024            |                       | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 12/11/2024              |                         | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 10 | 1    | 1          | 1    | Não Iniciado      | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Desenvolver aplicação para acionamento de emerg...   | 14/11/2024            | 14/11/2024            | Sistema de acionamento emergencial de equi...    | 07/10/2024              | 04/10/2024              | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 10 | 1    | 1          | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Experimentação da solução em gabinetes piloto        | 22/11/2024            | 22/11/2024            | Criação automatizada de ementas                  | 28/10/2024              | 28/10/2024              | Em execução       | Desembargadores                                                   | 10 | 1    | 40         | 1    | Concluído         | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Instalação e configuração do Sistema Argos em pro... | 22/11/2024            |                       | Implantação do piloto do Sistema Argos no R...   | 01/07/2024              | 01/07/2024              | Em execução       | Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações       | 10 | 1    | 1          | 1    | Em Andamento      | Não                 | Não            | Não              |
| 10                  | Integração e ajustes na versão 2.12.x do Pte         | 22/11/2024            | 22/11/2024            | Pte - eCarta Nacional (CSIT)                     | 19/08/2024              | 19/08/2024              | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       | 10 | 10   | 1          | 1    | Concluído         | Não                 | Não            | Não              |
| 10                  | Implantar a versão KC 25 em ambiente de produção     | 25/11/2024            |                       | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 21/11/2024              |                         | Em execução       | Divisão de Arquitetura de Soluções                                | 10 | 1    | 1          | 1    | Não Iniciado      | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Aquisições de materiais de áudio para a reforma      | 29/11/2024            |                       | Reforma da Sala de Sonorização do RBS28          | 30/09/2024              | 30/09/2024              | Em execução       | Divisão de Suporte Técnico à Audiências e Eventos                 | 10 | 1    | 1          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Desenvolver aplicação para acompanhar as soliciç...  | 29/11/2024            |                       | Sistema de acionamento emergencial de equi...    | 25/10/2024              | 25/10/2024              | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 10 | 1    | 1          | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Execução de uma contratação real como piloto do L... | 29/11/2024            |                       | Processo de contratações de TI via Vetr com L... | 02/09/2024              | 02/09/2024              | Em execução       | Coordenadoria de Gestão de Tics                                   | 10 | 1    | 15         | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Implementação de funcionalidades no Vetr - versã...  | 29/11/2024            |                       | Conselho de Promoção de Magistrados              | 10/07/2023              | 10/07/2023              | Em execução       | Secretaria da Corregedoria Regional                               | 10 | 1    | 1          | 1    | Em Andamento      | Não                 | Não            | Não              |
| 10                  | Implementação de MFA nas contas de email da ár...    | 29/11/2024            |                       | Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...   | 10/06/2024              | 10/06/2024              | Em execução       | Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação            | 10 | 1    | 1          | 1    | Em Andamento      | Não                 | Não            | Não              |
| 10                  | Implementação de MFA nas contas de email de tod...   | 29/11/2024            |                       | Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...   | 21/05/2024              | 21/05/2024              | Em execução       | Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação            | 10 | 1    | 1          | 1    | Em Andamento      | Não                 | Não            | Não              |
| 10                  | Módulo de Concessões e Habilitações                  | 29/11/2024            |                       | Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ... | 18/11/2024              |                         | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | 10 | 1    | 1          | 1    | Não Iniciado      | Sim                 | Não            | Não              |
| 10                  | Preenchimento da planilha de ações a serem tomad...  | 29/11/2024            |                       | Acompanhamento das Ações Ouidas da Pres...       | 14/10/2024              | 14/10/2024              | Em execução       | Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações       | 10 | 1    | 1          | 1    | Em Andamento      | Não                 | Não            | Não              |
| 10                  | Aperfeiçoamento do prompt e modelo de IA             | 30/11/2024            |                       | Criação automatizada de ementas                  | 06/11/2024              | 06/11/2024              | Em execução       | Desembargadores                                                   | 10 | 2    | 30         | 1    | Em Andamento      | Sim                 | Não            | Não              |

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Recursos de Projetos de TI



## Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 27/11/2024 13:30

| Servidores STI | Projetos | Servidores TRT Alocados em Projetos | Realocação de Recursos | Servidores Atuando em Projetos |
|----------------|----------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1              | 38       | 117                                 | 60                     | 23                             |

| Projeto | Últimas alocações de Servidores de TI |                 | Servidores alocados em Projetos |            |      |                             |
|---------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|------|-----------------------------|
| Todos   | Nome                                  | Última Alocação | Início                          | Fim        | Nome | Projeto                     |
|         | Eduardo Silveira Rocha                | 29/08/2025      | 15/10/2024                      | 19/12/2024 |      | Atendimento à resolução C   |
|         |                                       |                 | 06/03/2023                      | 28/09/2023 |      | Aquisição de servidores de  |
|         |                                       |                 | 19/09/2024                      | 15/10/2025 |      | Aquisição switches SAN - C  |
|         |                                       |                 | 17/05/2023                      | 24/01/2024 |      | RJ-22 - Identificador AJ/JT |
|         |                                       |                 | 03/07/2023                      | 19/12/2024 |      | Controle de Promoção de     |
|         |                                       |                 | 06/03/2023                      | 28/09/2023 |      | Aquisição de servidores de  |
|         |                                       |                 | 05/03/2024                      | 31/10/2024 |      | Novo Portal da Intranet     |
|         |                                       |                 | 19/09/2024                      | 15/10/2025 |      | Aquisição switches SAN - C  |
|         |                                       |                 | 20/09/2024                      | 09/01/2026 |      | Reforma da Sala de Sonori   |

| Servidores Atuando em Projetos |              |      |                    |                   |
|--------------------------------|--------------|------|--------------------|-------------------|
| Início Previsto                | Fim Previsto | Nome | Etapa              | Tarefa            |
| 17/07/2023                     | 30/11/2023   |      | Levantament...     |                   |
| 13/11/2023                     | 26/07/2024   |      | 1 - Document...    | Acompanhament     |
| 13/11/2023                     | 26/07/2024   |      | 2 - Implemen...    | Acompanhament     |
| 30/06/2025                     | 25/07/2025   |      | Avaliar os ite...  | Preencher e enca  |
| 30/06/2025                     | 25/07/2025   |      | Executar as aç...  | Preencher e enca  |
| 30/06/2025                     | 25/07/2025   |      | Pré-diagnosti...   | Preencher e enca  |
| 30/06/2025                     | 25/07/2025   |      | Reavaliar os it... | Preencher e enca  |
| 02/06/2025                     | 27/06/2025   |      | Avaliar os ite...  | Atualizar o queti |

Projeto

Todos

Status

Todos

Gerente

Todos

Unidade Responsável

Todos

Parte Interessada

Todos

Alocação Vencida TI

Todos

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Projetos concluídos no período (2024)



## Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 27/11/2024 13:30

| Data na situação concluído |                                                    |                                                                               |                 |               |            | Projetos concluídos no período |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------------|------------|
| 01/01/2024                 |                                                    | 25/10/2024                                                                    |                 |               |            | 21                             |            |
| Editar                     | Projeto                                            | Descrição                                                                     | Área do Projeto | Data de En... | Início     | Fim                            | Duração... |
|                            | 296446 - Substituição de desktops 2023             | No final de 2022 foram adquiridos 1500 microcomputadores do tipo des...       |                 | 15/01/2024    | 06/03/2023 | 15/01/2024                     | 315        |
|                            | 310788 - Codex - Acompanhamento das açõe...        | Ações de manutenção evolutiva do sistema                                      | SGJ             | 02/02/2024    | 09/01/2024 | 02/02/2024                     | 24         |
|                            | 307570 - Controle de Envio de e-mails Corpor...    | Desenvolver solução que possibilite o controle de envio de e-mails instit...  | CSMSA           | 13/02/2024    | 24/01/2024 | 23/02/2024                     | 30         |
|                            | 312836 - Relatório de Alteração de Cargo           | Desenvolver relatório para que a Corregedoria possa verificar as alteraçõ...  | CSMSJ           | 04/03/2024    | 07/02/2024 | 04/03/2024                     | 26         |
|                            | 270951 - Solária                                   | Sistema que reúne robôs (automações computacionais) para automatiza...        | CSMSJ           | 15/03/2024    | 11/01/2021 | 15/03/2024                     | 1159       |
|                            | 310853 - Roteiro de Sessões Pleno - Acompan...     | Acompanhamento da integração com o sistema PjeCor                             | SGJ             | 26/03/2024    | 29/01/2024 | 26/03/2024                     | 57         |
|                            | 255236 - Revisão de Políticas de PDS e PMS (R...   | Revisar as políticas dos processos de maneira a atender a Res. CNJ 370        | CGOVTIC         | 04/04/2024    | 17/05/2023 | 04/04/2024                     | 323        |
|                            | 291914 - Revisão da Política de Contratações ...   | Revisar a Política de Contratações de Soluções de TIC, de acordo com a ...    | CGOVTIC         | 04/04/2024    | 02/10/2023 | 04/04/2024                     | 185        |
|                            | 306897 - POC de uso de Inteligência Artificial ... | Usar ferramenta de Inteligência Artificial Generativa para produzir respos... | CSMSJ           | 23/04/2024    | 06/11/2023 | 23/04/2024                     | 169        |
|                            | 292521 - Storages - Prorrogação suporte ou n...    | Estudos para prorrogação de suporte ou aquisição de novos equipamen...        | CIV             | 29/04/2024    | 06/11/2023 | 29/04/2024                     | 175        |
|                            | 312020 - PAD e Sindicâncias                        | Essa demanda foi deliberada pelo Comitê de Ética e Integridade do Tribu...    | SGTIC           | 06/05/2024    | 22/01/2024 | 06/05/2024                     | 105        |
|                            | 314176 - Anexador automático de email a pro...     | Permitir que Vetor anexe automaticamente a um processo um arquivo a...        | CSMSA           | 15/05/2024    | 19/02/2024 | 15/05/2024                     | 86         |
|                            | 314233 - Conversão de voz para texto               | Prospectar solução para converter vídeos de processos judiciais em texto...   | CSMSJ           | 29/05/2024    | 19/02/2024 | 29/05/2024                     | 100        |
|                            | 173653 - MNI 3.0                                   | Projeto nacional responsável por definir e implementar a versão 3.x do ...    | CSMSJ           | 12/07/2024    | 11/07/2018 | 09/07/2024                     | 2190       |
|                            | 321020 - Atendimento à resolução CSJT 296/2...     | Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Res...       | CSMSA           | 17/07/2024    | 20/05/2024 | 12/07/2024                     | 53         |
|                            | 304184 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-...    | Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iG...     | CGOVTIC         | 19/07/2024    | 25/03/2024 | 19/07/2024                     | 116        |
|                            | 309307 - Sistema de Controle de Esforço            | O sistema consiste em um modelo com uma série de registros de esforç...       | CGTIC           | 09/08/2024    | 08/01/2024 | 02/08/2024                     | 207        |
|                            | 318671 - Binário Protegido - Salvaguarda e Mi...   | Projeto para analisar e implementar política e rotina de backup dos arq...    | NGSI            | 18/09/2024    | 02/02/2024 | 18/09/2024                     | 229        |
|                            | 310852 - Acomp - Acompanhamento das aç...          | Acompanhamento das ações de manutenção evolutiva do sistema suger...          | SGJ             | 27/09/2024    | 17/01/2024 | 03/09/2024                     | 230        |
|                            | 327330 - Melhoria do Sistema de Registro de ...    | Aprimoramentos do Sistema de Registro de Esforço após a sua implanta...       | CGTIC           | 08/10/2024    | 06/08/2024 | 08/10/2024                     | 63         |
|                            | 321021 - Indicação de Reconhecimento do TR...      | Permitir a execução do Programa de Reconhecimento do TRT-9, edição 2...       | CSMSA           | 25/10/2024    | 15/07/2024 | 25/10/2024                     | 102        |
