



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

RICARDO
ERBANO 07
/02/2025
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/02/2025
SGTIC TRT9

Ata/Pauta - 22.01.2025 - 1ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13604995)

Agendamento (ID 13604996)

Data: 22/01/2025

Horário: 10:00

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR



DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE
SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR -
COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA
DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Manassés Dallagassa
Eduardo Silveira Rocha
Eladir Prados
Filipe Lautert
Igor Reis De Godoi
Luiz Fernando Klahold
Omar Carvalho
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erbano
Robson Cleiton Novak
Roverli Pereira Ziwich
Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Wellington Luiz Gaboardi


RICARDO
ERBANO 07
/02/2025
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/02/2025
SGTIC TRT9

Link da reunião gravada: https://drive.google.com/file/d/1vNu8C91lvvvMKArrN2Ye_AZBeV3GMbp_/view

Itens da reunião (ID 13605004)

Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 13605005)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Wellington Gaboardi apresentou o andamento dos atuais projetos de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>).

Desde a última apresentação dos andamentos de projetos, houve o cadastro de duas novas demandas: “fase 2 do sistema de acionamento emergencial” e “análise de admissibilidade em recursos”.

Conforme o painel de projetos, atualmente há 37 projetos, com 31 em execução.

Feito um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC (STIC) com as principais ocorrências nos projetos.

Durante o ano de 2024, foram concluídos 22 projetos de TI.





RICARDO
ERBANO 07
/02/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/02/2025
SGTIC TRT9

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Eduardo Rocha solicitou que os painéis sejam certificados com Omar Carvalho e disponibilizados no portal do iNove.

Wellington programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do Comitê STIC.

anexo: [Download: Projetos_STIC_22_01_2025.pdf](#)

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação/acompanhamento orçamento da TI (ID 13611551)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento da TI.

Descrição:

Luiz Fernando Klahold fez a prestação de contas, para os membros do comitê, do resultado orçamentário da TI de 2024, divulgando os links para acompanhamento dos painéis que demonstram os itens de execução do SIGEO, o plano de contratações e restos a pagar. Salientou que houve uma programação inicial de aproximadamente 16 milhões e, ao fim do exercício, um empenho de 32 milhões, considerando os aportes orçamentários do CSJT e da DG.

Salientou que foi um recorde, um orçamento de aproximadamente R\$ 32 milhões, que corresponderam a um empenho de 99,84%, e uma despesa liquidada de aproximadamente R\$ 28.766.000,00 correspondendo a 89,40%. Citou que estão preparando um documento com as justificativas dos itens que ficaram em restos a pagar, tendo em vista que os valores inicialmente previstos foram menores para este item, que resultaram num montante aproximado de R\$ 5.647.000,00, dos quais já foram pagos arredondados no valor de R\$ 1.663.000,00, sendo que o saldo deverá ser executado ou cancelado neste início de ano e nos próximos meses.

Citou a existência do painel com o Plano Anual de Contratações, desenvolvido pela SGE, com o calendário de Instruções para verificação de alguma pendência pelos gestores.

Eduardo Rocha destacou que existe um modelo de processo de contratação, por enquanto somente para a TI, no sistema vetor, sendo que um dos benefícios será a atualização automática das informações da execução dos procedimentos necessários às contratações e à efetiva execução orçamentária.





RICARDO
ERBANO 07
/02/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 18
/02/2025
SGTIC TRT9

Eduardo salientou que todas as providências devem ser feitas utilizando o processo de contratação do vetor e se colocou à disposição para treinamentos a respeito, pois é um modelo que traz muitas facilidades e seu uso não é opcional na TI, inclusive já está automatizado.

Feito o acompanhamento dos itens que estavam programados para serem revistos com os respectivos responsáveis nesta data.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Eduardo Rocha solicitou que os painéis apresentados pelo Luiz Klahold sejam certificados com Omar Carvalho e disponibilizados no portal do Inove.

Eduardo Rocha destacou a obrigatoriedade da utilização dos modelos de contratação no sistema Vetor na SGTIC.

Luiz atualizar planilha de acompanhamento com as informações passadas pelos responsáveis de cada contratação e programar os itens que devem ser novamente revistos nas próximas reuniões do comitê STIC.

Monitoramento PDTIC?: Sim



STIC- Videoconferência realizada no dia 22/01/2025
(Painel com informações de 23/01/2025)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Demandas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Programas

Programas

Atualizado em 23/01/2025 15:02

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
6	134	15	6	9		

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Programas

Editar

Programas

Programa Aceleração Digital

Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...

Programa de Governança em Privacidade

Programa Sistematização e organização dos at...

Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)

Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...	16/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	31/12/22	0,67
Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	31/12/22	0,17
Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa	30/11/23	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...	30/11/23	0,07
Número de serviços digitalizados para o cidadão	30/11/23	43,33
Número de serviços digitalizados usando robô, preferencialmente com IA	30/11/23	3,50

Projetos

Editar

Nome do Projeto

101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362

256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)

256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação

295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados


306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos

289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos

255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37

255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Projetos

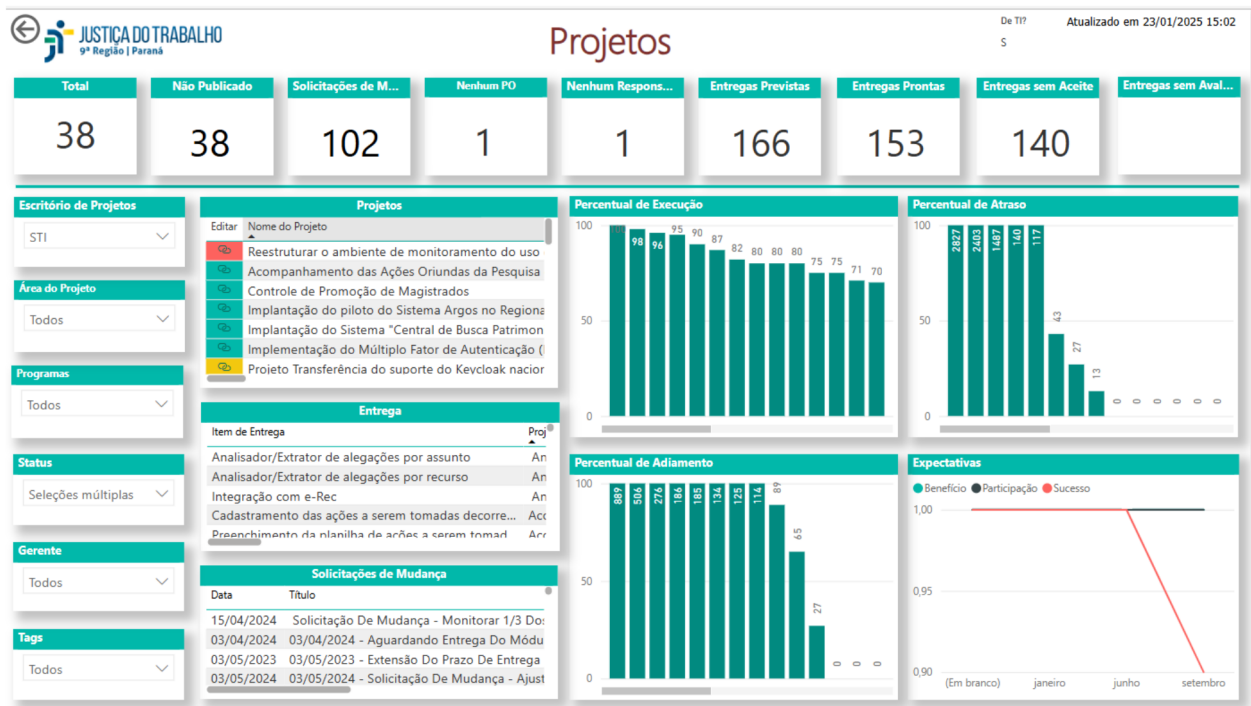


Voltar ao relatório		PROJETOS	
Editar	Nome do Projeto	Status	
	Reestruturar o ambiente de monitoramento do uso das Impressoras de rede do TRT9 e reformular painéis de BI re...	Em planejamento	
	Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação Interna e Externa dos Usuários com TIC 2024	Em execução	
	Controle de Promoção de Magistrados	Em execução	
	Implantação do piloto do Sistema Argos no Regional	Em execução	
	Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / SIGEP (TRT18)	Em execução	
	Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9	Em execução	
	Projeto Transferência do suporte do Keycloak nacional (Sigeo) do TRT-22 para o TRT9	Em execução	
	Melhoria dos resultados do GovTIC-JUD de 2025 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em planejamento	
	Projeto de atendimento às recomendações de auditoria do CSJT para Processos ITIL	Em execução	
	Desativação do Office	Suspensão	
	Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TRT9	Em execução	
	Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio Eletoral	Em execução	
	Nacionalização do sistema Solária	Em execução	
	Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgãos Colegiados do TRT9	Em execução	
	Projeto Nacionalização do sistema Falcão	Em execução	
	Relatórios de Precatórios	Em execução	
	Relatórios de Precatórios	Em execução	
	RJ-22 - Identificador AJ/JT	Suspensão	
	RJ-23 - Registra no PJe a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão	
	RJ-26 - Realiza juntada de documentos entre autos no PJe	Em execução	
	RJ-27 - Certifica a alteração de status de requisição de pagamento no sistema AJ/JT	Suspensão	
	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)	Em execução	
	Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte	Em execução	
	Controle de Sucessões	Em execução	
	Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)	Em execução	
	Nacionalização do modelo de colegiados temáticos do vetor	Suspensão	
	Processo de contratações de TI via Votor com integração ao PROAD	Em execução	
	Reforma da Sala de Sonorização do RB528	Em execução	
	Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI	Em execução	
	Sistematização de atos normativos	Em execução	
	Análise de Recurso de Revista com IA	Em execução	
	Aquisição de servidores de processamento de dados - Descentralização	Em execução	
	Aquisição switches SAN - Descentralização	Em execução	
	Criação automatizada de ementas	Em execução	
	Evolução do e-Rec Internalização	Em execução	
	PJe - eCarta Nacional (CSJT)	Em execução	
	PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos	Em execução	
	PJe-AssistRR - Assistente de Edição de Recurso de Revista	Em execução	

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Novembro/2024

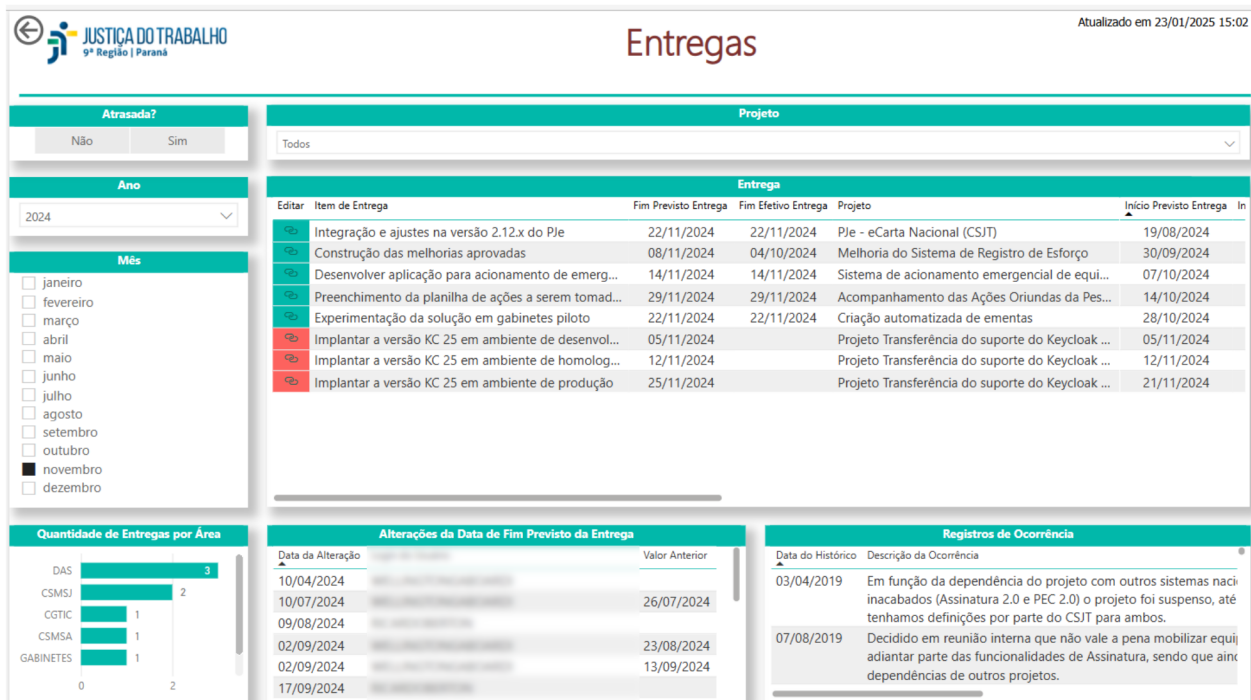

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Dezembro/2024



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Janeiro/2025

Voltar ao resumo		ENTREGA																				
Nome Item da Entrega		Fim Previsão Entrega		Fim Objetivo Entrega		Projeto		Início Previsão Entrega		Início Objetivo Entrega		Status do Projeto		Área do Projeto		UML	Prioridade	Peso	Status da Entrega	Entrega em Produção	Entrega Acabada	Entrega Avaliada
1	Módulo de Serviços	10/01/2025				Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...		20/11/2023		20/11/2023		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Implementação de MFA nas contas de email de tod...	31/01/2025				Implementação do Múltiplo Fator de Autentic...		21/05/2024		21/05/2024		Em execução		Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação		1	1	1	Em Andamento	Não	Não	Não
2	Importação de precedentes direta do BNP (Banco N...	31/01/2025		16/01/2025		Faísco - Projeto Pesquisa Jurisprudência do TR...		01/07/2024		15/06/2024		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		12	5	3	Concluído	Sim	Não	Não
	Criação de modelo para cadastro de políticas e atos...	31/01/2025				Sistematização de atos normativos		02/09/2024		02/09/2024		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		7	1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
3	Execução de uma contratação real como piloto do f...	31/01/2025				Processo de contratações de TI via Votor com L...		02/09/2024		02/09/2024		Em execução		Coordenadoria de Gestão de Tlc		1	15	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Conservação dos reatros	31/01/2025				Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...		15/10/2024		15/10/2024		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
4	Constituição dos Relatórios	31/01/2025				Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase ...		15/10/2024		15/10/2024		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
	TRT9 iniciar o atendimento de chamados juntament...	06/01/2025				Projeto Transferência do suporte do Keycloak ...		04/11/2024		04/11/2024		Em execução		Divisão de Arquitetura de Soluções		1	1	1	Não Iniciado	Sim	Não	Não
5	Analisador/Extrator de alegações por assunto	24/01/2025		19/12/2024		Análise de Recurso de Revista com IA		25/11/2024		25/11/2024		Em execução		Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial		1	1	1	Concluído	Sim	Não	Não
	Ampliação do uso em infraestrutura definitiva do C...	31/01/2025				Criação automatizada de ementas		02/12/2024		07/01/2025		Em execução		Desenvolvedores		3	10	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
6	Cadastro das ações a serem tomadas decomp...	31/01/2025				Acompanhamento das Ações Oridnas da Pes...		02/12/2024		02/12/2024		Em execução		Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações		1	1	1	Em Andamento	Não	Não	Não
	Implantação e homologação da solução em produç...	24/01/2025				Sistema de acionamento emergencial de equi...		16/12/2024		16/12/2024		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
7	Instalação dos equipamentos	31/01/2025				Aquisição de servidores de processamento de ...		07/01/2025		07/01/2025		Em execução		Coordenadoria de Infraestrutura		4	1	1	Em Andamento	Sim	Não	Não
	Módulo de Concessões e Habilitações	17/01/2025				Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...		07/01/2025		07/01/2025		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	1	Não Iniciado	Sim	Não	Não
8	Exclusão do banco Biv do Postgres (3a fase - rem...	19/01/2025				Pis Brincos - Armazenamento em sistemas de...		17/01/2025		17/01/2025		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		99	1	1	Não Iniciado	Sim	Não	Não
	Módulo de Tercários	31/01/2025				Controle de Recursos - Segurança Patrimonial ...		20/01/2025		20/01/2025		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos		1	1	1	Não Iniciado	Sim	Não	Não
9	Tutorial do RJ13 nacional para assédio eleitoral	31/01/2025				Nacionalização do RJ-13 para tratar Assédio El...		20/01/2025		13/01/2025		Em execução		Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários		4	5	1	Em Andamento	Sim	Não	Não

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI



Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 23/01/2025 15:02

Servidores STI	Projetos	Servidores TRT Alocados em Projetos	Realocação de Recursos	Servidores Atuando em Projetos
1	41	118	60	23

Projeto	Últimas alocações de Servidores de TI		Servidores alocados em Projetos			
Todos	Nome	Última Alocação	Início	Fim	Nome	Projeto
		29/08/2025	15/10/2024	19/12/2024		Atendimento à resolução C
			25/11/2024	21/02/2025		Controle de Sucessões
			06/03/2023	28/09/2023		Aquisição de servidores de
			19/09/2024	15/10/2025		Aquisição switches SAN - I
			17/05/2023	24/01/2024		RJ-22 - Identificador A/J/JT
			03/07/2023	27/06/2025		Controle de Promoção de
			06/03/2023	28/09/2023		Aquisição de servidores de
			19/09/2024	15/10/2025		Aquisição switches SAN - I
			20/09/2024	09/01/2026		Reforma da Sala de Sonori

Servidores Atuando em Projetos			
Início Previsto	Fim Previsto	Etapas	Tarefa
17/07/2023	30/11/2023	Levantament...	
13/11/2023	26/07/2024	1 - Document...	Acompanhament
13/11/2023	26/07/2024	2 - Implemen...	Acompanhament
30/06/2025	25/07/2025	Avaliar os ite...	Preencher e enca
30/06/2025	25/07/2025	Executar as aç...	Preencher e enca
30/06/2025	25/07/2025	Pré-diagnosti...	Preencher e enca
30/06/2025	25/07/2025	Reavaliar os it...	Preencher e enca

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI

PDS

		Processo de Desenvolvimento de Software		Atualizado em 23/01/2025 15:02
Quantidade de Projetos de Desenvolvimento		Projetos de Desenvolvimento sem o uso do PDS		Média do Indicador de Aderência ao PDS
1		1		(Em branco)
Projeto	IAPDS	Pendência	Editar	IAPDS por Projeto
Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 2)		N		

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Projetos concluídos no período (2024)

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 23/01/2025 15:02

Data na situação concluído

01/01/202428/11/2024

Projetos concluídos no período

22

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
	296446 - Substituição de desktops 2023	No final de 2022 foram adquiridos 1500 microcomputadores do tipo des...		15/01/2024	06/03/2023	15/01/2024	315
	310788 - Codex - Acompanhamento das açõe...	Ações de manutenção evolutiva do sistema	SGJ	02/02/2024	09/01/2024	02/02/2024	24
	307570 - Controle de Envio de e-mails Corpor...	Desenvolver solução que possibilite o controle de envio de e-mails instit...	CSMSA	23/02/2024	24/01/2024	23/02/2024	30
	312836 - Relatório de Alteração de Cargo	Desenvolver relatório para que a Corregedoria possa verificar as alteraçõ...	CSMSJ	04/03/2024	07/02/2024	04/03/2024	26
	270951 - Solária	Sistema que reúne robôs (automações computacionais) para automatiza...	CSMSJ	15/03/2024	11/01/2021	15/03/2024	1159
	310853 - Roteiro de Sessões Pleno - Acompan...	Acompanhamento da integração com o sistema PjeCor	SGJ	26/03/2024	29/01/2024	26/03/2024	57
	255236 - Revisão de Políticas de PDS e PMS (R...	Revisar as políticas dos processos de maneira a atender a Res. CNJ 370	CGOVTIC	04/04/2024	17/05/2023	04/04/2024	323
	291914 - Revisão da Política de Contratações ...	Revisar a Política de Contratações de Soluções de TIC, de acordo com a ...	CGOVTIC	04/04/2024	02/10/2023	04/04/2024	185
	306897 - POC de uso de Inteligência Artificial ...	Usar ferramenta de Inteligência Artificial Generativa para produzir respos...	CSMSJ	23/04/2024	06/11/2023	23/04/2024	169
	292521 - Storages - Prorrogação suporte ou n...	Estudos para prorrogação de suporte ou aquisição de novos equipamen...	CIV	29/04/2024	06/11/2023	29/04/2024	175
	312020 - PAD e Sindicâncias	Essa demanda foi deliberada pelo Comitê de Ética e Integridade do Tribu...	SGTIC	06/05/2024	22/01/2024	06/05/2024	105
	314176 - Anexador automático de email a pro...	Permitir que Vetor anexe automaticamente a um processo um arquivo a...	CSMSA	15/05/2024	19/02/2024	15/05/2024	86
	314233 - Conversão de voz para texto	Prospectar solução para converter vídeos de processos judiciais em text...	CSMSJ	29/05/2024	19/02/2024	29/05/2024	100
	173653 - MNI 3.0	Projeto nacional responsável por definir e implementar a versão 3.x do ...	CSMSJ	12/07/2024	11/07/2018	09/07/2024	2190
	321020 - Atendimento à resolução CSJT 296/2...	Criar os mecanismos necessários para atender de forma adequada à Res...	CSMSA	17/07/2024	20/05/2024	12/07/2024	53
	304184 - Melhoria dos resultados do iGovTIC-...	Melhorar processos e políticas para alcançar um resultado melhor no iG...	CGOVTIC	19/07/2024	25/03/2024	19/07/2024	116
	309307 - Sistema de Controle de Esforço	O sistema consiste em um modelo com uma série de registros de esforç...	CGTIC	09/08/2024	08/01/2024	02/08/2024	207
	318671 - Binário Protegido - Salvaguarda e Mi...	Projeto para analisar e implementar política e rotina de backup dos arq...	NGSI	18/09/2024	02/02/2024	18/09/2024	229
	310852 - Acomp - Acompanhamento das aç...	Acompanhamento das ações de manutenção evolutiva do sistema suger...	SGJ	27/09/2024	17/01/2024	03/09/2024	230
	327330 - Melhoria do Sistema de Registro de ...	Aprimoramentos do Sistema de Registro de Esforço após a sua implanta...	CGTIC	08/10/2024	06/08/2024	08/10/2024	63
	321021 - Indicação de Reconhecimento do TR...	Permitir a execução do Programa de Reconhecimento do TRT-9, edição ...	CSMSA	25/10/2024	15/07/2024	25/10/2024	102
	315915 - Novo Portal da Intranet	Projeto para desenvolvimento de um novo portal de serviços do TRT9, q...	CSMSA	28/11/2024	05/03/2024	28/10/2024	237
