



Poder Judiciário Federal  
Tribunal Regional do Trabalho da 9.<sup>a</sup> Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)

RICARDO  
ERBANO 05  
/11/2025  
CGTIC TRT9

EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 07/11  
/2025 SGTIC  
TRT9

**Ata/Pauta - 10.09.2025 - 18ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13606544)**

**Agendamento (ID 13606545)**

**Data:** 10/09/2025

**Horário:** 14:00 até 15:40

**Reunião Extraordinária:** Não

**Convidados:**

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES



PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

**Local da reunião:** Telepresencial

**Participantes:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi  
Claucio Jorge De Lima  
Daniel Adriano Pinto Da Silva  
Daniel Vicente Thomazv  
Eduardo Luiz Biscouto  
Eduardo Silveira Rocha  
Filipe Lautert  
Hugo Signoretti Netto  
Igor Reis De Godoi  
Luis Guilherme Baptista Cordeiro  
Luiz Fernando Klahold  
Omar Carvalho  
Paulo Roberto Nunes  
Ramon Pereira Molossi  
Ricardo Erban  
Walter Ribeiro De Oliveira Junior  
Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO  
ERBANO 05  
/11/2025  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 07/11  
/2025 SGTIC  
TRT9

**Link da reunião gravada:** <https://drive.google.com/file/d/1tZLK3oDcVSmfXqn6RnYpiVLL94k1cCjS/view>

**Itens da reunião (ID 13606553)**

**Acompanhamento das contratações e do orçamento de TI (ID 13606554)**

**Nome do item:** Acompanhamento das contratações e do orçamento de TI.

**Descrição:**

Eduardo Biscouto iniciou a apresentação informando sobre a contratação do firewall, tratada devido à sua criticidade como emergencial, destacando prazos e valores disponíveis para integralizar a contratação neste exercício.





Eduardo Rocha esclareceu que, em uma contratação por três meses, há o risco de, no começo do próximo ano, com a liberação de duodécimos, não haver orçamento para contratação, razão pela qual vai priorizá-la. Sobre os *endpoints*, destacou que o CSJT planejou uma aquisição nacional, mas esse planejamento não foi cumprido pelo Tribunal responsável. Diante disso, Eduardo entende que podemos fazer uma contratação emergencial pelo tempo necessário para que essa licitação seja concluída, conforme planejado pelo CSJT, e isso evita a necessidade de se fazer uma nova licitação às pressas.

Hugo Signoretti Netto informou sobre a tentativa de obtenção de licença temporária com o atual fornecedor dos *endpoints* e que talvez consigam manter o produto funcionando temporariamente sem a necessidade de contratação emergencial, até a conclusão da licitação nacional, sem custos adicionais.

Luiz Klahold continuou a apresentação sobre o acompanhamento dos itens que estavam programados para serem revistos com os respectivos responsáveis na presente data.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Luiz Fernando Klahold, atualizar planilha de acompanhamento com as informações passadas pelos responsáveis de cada contratação e programar os itens que devem ser novamente revistos nas próximas reuniões do comitê STIC.

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## **Demonstração do painel de tarefas do Vetor (ID 16783323)**

**Nome do item:** Demonstração do painel de tarefas do Vetor.

### **Descrição:**

Ricardo Ervano inicia sua apresentação informando a situação da sua unidade, destacando que tem duas tarefas de monitoramento de risco que estão atrasadas e o servidor Wellington já está acompanhando a situação.

Eduardo Silveira Rocha solicita ao Igor para incluir, se possível, uma segunda linha referente ao saldo acumulado de tarefas em atraso, porque o volume de tarefas pendentes é importante, mas o mais importante é não haver tarefas em atraso.





RICARDO  
ERBANO 05  
/11/2025  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 07/11  
/2025 SGTIC  
TRT9

Omar Carvalho questiona sobre a alteração na data inicialmente criada para a tarefa, quando ainda está pendente alguma informação para a conclusão. Eduardo Rocha orienta que seja negociada uma data com a unidade, podendo devolver a tarefa para o demandante para ser corrigida a data, pois não tem como o demandado alterar a data, por ser regra do negócio e para se ter uma segurança.

Alexandre Tetsuo Yamauchi informa que na Secretaria de Infraestrutura e Operações e unidades subordinadas há nove tarefas atrasadas, muitas que apareceram em atraso na reunião passada foram simplesmente por conta do fechamento da tarefa em si, pois já haviam sido atendidas, mas não eram movimentadas por falta de costume da equipe com o painel. Esclareceu que as duas primeiras tarefas são correlacionadas, se referem ao cadastro de obrigações no vetor da política de serviços. Na determinação dessa política, havia cinco serviços obrigatórios que eram de implementação quase que imediata e essas já foram atendidas e estão cadastradas, e existem outras que não são obrigatórias, têm um prazo maior e depende da maturidade do Órgão e a tarefa acabou ficando aberta.

Eduardo Silveira Rocha orienta que já pode cadastrar as outras obrigações com a data dos prazos, porque, quando cadastra obrigação, pode-se estabelecer um prazo bem à frente, podendo delegar essa discussão ao tempo adequado e, desta forma, encerrando essas tarefas.

Daniel Vicente Thomaz informa que na Secretaria de Desenvolvimento de Soluções e unidades subordinadas estão com quarenta e uma tarefas atrasadas, destacando que na reunião anterior estavam com o dobro deste número e que realizaram primeiramente um trabalho de saneamento, limpando as tarefas que já foram cumpridas. Destaca que muitas demandas não são atendidas no prazo solicitado pelo demandante por se tratarem de melhorias, ou estarem vinculadas a outras iniciativas ou projetos. Eduardo Silveira Rocha orienta que o correto é vincular a tarefa ao projeto e retornar a tarefa ao demandante para que se faça o ajuste do prazo, colocando a informação no relatório e avisando o demandante, pois nessa situação o sistema não manda notificação.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Gestores apresentarem o quadro geral de tarefas de suas respectivas unidades subordinadas nas próximas reuniões do STIC.



**Monitoramento PDTIC?:** Não

## **Apresentação / acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 16783316)**

---

  
RICARDO  
ERBANO 05  
/11/2025  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 07/11  
/2025 SGTIC  
TRT9

**Nome do item:** Apresentação / acompanhamento andamento dos projetos de TI.

**Descrição:**

Wellington Luiz Gaboardi inicia a apresentação, apresentando o painel de BI de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>) destacando que o projeto sistema complementar da designação de magistrados retornou para a execução.

Informa que surgiram duas novas demandas: o sistema para votação de eleição de cargos e o sistema de controle da planilha de preços.

Foi destacada a questão do painel também para mostrar as pendências e os projetos em andamento com os responsáveis.

Informa que foram 15 entregas até o momento.

Sobre os projetos concluídos, informa que ainda continuam com 15, mas nesta semana haverá também o encerramento dos projetos eCarta e Assist-RR.

**Solução Proposta:**

-

**Deliberação:**

Wellington Gaboardi programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do Comitê STIC.

**anexo:** [Download: Projetos\\_STIC\\_10\\_09\\_2025.pdf](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## **Ato retirada acessos PJe inativos (ID 16783309)**

---

**Nome do item:** Ato retirada acessos PJe inativos.

**Descrição:**

Daniel Adriano da Silva inicia a apresentação do primeiro ato, que trata da desativação dos acessos dos usuários inativos do PJe. Esclarece que esse ato foi determinado por um despacho da Presidência que solicitou a elaboração de um normativo para disciplinar a questão da desativação desses acessos, quando os



usuários são removidos ou desligados do Tribunal. Destaca que as normas vigentes não dispõem especificamente sobre as providências a serem adotadas no PJe em caso de desligamento de usuários, configurando uma lacuna normativa cujo preenchimento se mostra essencial para o controle de acessos ao sistema.

Foi esclarecido que a Resolução 185, que trata dos acessos do PJe, atribui à figura do juiz gestor a responsabilidade por gerir os acessos à sua Unidade.

O novo Ato atribui à SGTIC (Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações) a responsabilidade pela verificação dos usuários que tenham sido desligados definitivamente do Tribunal ou removidos de unidade judiciária para unidade administrativa, cabendo à área de TI proceder à imediata alteração do respectivo acesso ao PJe ou ao seu desligamento. Foram feitos os esclarecimentos e ressalvas sobre os termos do Ato com os responsáveis.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Membros do subcomitê aprovam o Ato de desativação de acessos de usuários inativos do PJe.

### **Monitoramento PDTIC?: Não**

## **Ato de bloqueio de acesso a sistemas por geolocalização (ID 16783302)**

**Nome do item:** Ato de bloqueio de acesso a sistemas por geolocalização.

### **Descrição:**

Daniel Adriano Pinto Da Silva esclarece que o Ato dispõe sobre o bloqueio de acesso a sistemas por geolocalização no âmbito do TRT9, podendo restringir o acesso aos sistemas corporativos do Tribunal acessíveis via internet a conexões originadas no território nacional, bloqueando por padrão acessos provenientes do exterior ou de origem não identificada.

Foi esclarecido que a proposta é simples: permitir o bloqueio de todos os acessos aos nossos serviços, com poucas exceções para conexões originadas do exterior; as exceções serão concedidas mediante requerimento e registro próprio, que será feito no Vetor, no Assyst ou em sistema que permita recuperar essa informação. Foi informado que esse Ato foi redigido com a participação das equipes da área de negócio e da infraestrutura, para garantir a exequibilidade do que está sendo proposto, pois trata-se de uma medida de segurança.



Foram feitos os esclarecimentos e ressalvas sobre os termos do Ato com os responsáveis.



RICARDO  
ERBANO 05  
/11/2025  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 07/11  
/2025 SGTIC  
TRT9

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

Membros aprovam o Ato, com a recomendação de que seja apresentado ao Comitê de Segurança e posterior encaminhamento à Presidência, com notificação ao Subcomitê Regional do PJe.


**Monitoramento PDTIC?: Não**



**STIC- Videoconferência realizada no dia 10/9/2025**  
**(Painel com informações de 10/9/2025)**

## Escritório de Projetos de TI

Atualizado em 10/09/2025 10:11

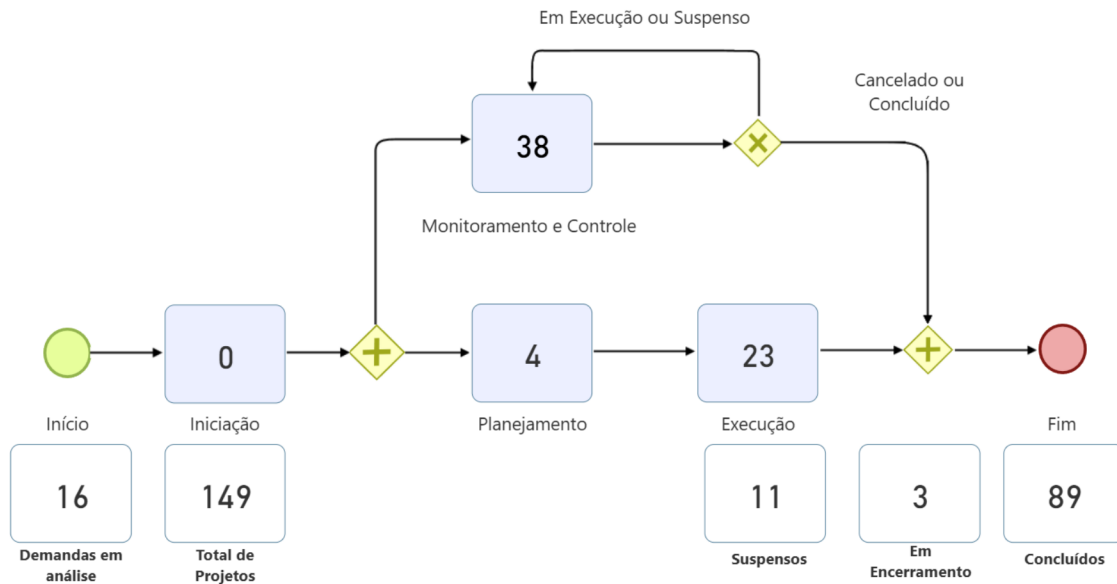



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Painel de Demandas



Atualizado em 10/09/2025 10:30

Total

16

Para Aprovação

15

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Escritório de Projetos

STI

Demandas

Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
	Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados	0,44	10/11/2023
	Ambiente Virtual de EAD para a Secretaria de Segurança Institucional	0,33	29/07/2024
	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0,64	19/09/2024
	PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial	0,62	23/10/2024
	Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em r...	0,44	18/11/2024
	Evolução dos recursos tecnológicos de videoconferência dentro das Sala de Audiências	0,59	13/12/2024
	Utilização de recursos de IA dentro da plataforma Zoom, incluindo transcrição de áudio e pres...		13/12/2024
	Cálculo de precatórios	0,64	14/02/2025
	Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)	0,78	07/03/2025
	Desativação do Sistema de Controle de Tramitação Administrativo (CTA)	0,42	08/04/2025
	Migração de aplicações para Docker	0,45	09/04/2025
	Federação com MPT-PR	0,41	10/04/2025
	Banco de Perícias	0,80	30/06/2025
	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)	0,56	01/07/2025
	Projeto distribuição processual por classes		08/08/2025

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Painel de Programas

Programas

Atualizado em 10/09/2025 13:31

Total

6

Projetos

151

Metas

16

Metas sem Previsão em Projeto

6

Metas sem Planejamento

10

Metas sem Tarefas

Metas Atendidas

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Estrutura definida, criada e implantada.	31/05/22	1,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...	16/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações	31/12/22	1,00
Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas	31/12/22	0,67
Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário	31/12/22	0,17
Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa	30/11/23	0,00
Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...	30/11/23	0,07

Projetos

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados
	306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos
	289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos
	255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37
	255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)



ENTREGA								
Voltar ao relatório								
Editar	Item de Entrega	Fin Previsto Entrega	Fin Efetivo Entrega	Projeto	Início Previsto Entrega	Início Efetivo Entrega	Status do Projeto	Área do Projeto
	Mudança de Computadores, Móveis e Pessoas para a nova sala	06/06/2025	13/06/2025	Reforma da Sala de Sonorização do RB528	20/05/2025	20/05/2025	Em execução	Divisão de Suporte Técnico A Audiências e Eventos
	Relatório de cargos das perícias	18/06/2025	18/06/2025	Sistema informatizado de controle de Perícias...	20/05/2025	28/04/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos
	Analísior/Extrator de alegações por recurso	20/06/2025	03/06/2025	Análise de Recurso de Revista com IA	27/01/2025	27/01/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial
	Implantação e-Card Nacional (produção) na 2.14.4	20/06/2025	02/06/2025	Pie - e-Card Nacional (CSJT)	23/05/2025	23/05/2025	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários
	Integração do módulo com as melhorias para a versão 2.13 em diante	20/06/2025	20/06/2025	Evolução do e-Rec Interanalização	07/01/2025	07/01/2025	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários
	Relatório PA x Precatórios	20/06/2025	13/02/2025	Relatórios de Precatórios	02/09/2024	02/09/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários
	Análise das colaborações elaborados	27/06/2025	16/07/2025	Acquisition switches SAN - Descentralização	19/09/2024	19/09/2024	Em execução	Coordenadoria de infraestrutura
	Conflito de precedentes e relacionamento dos temas de teses vinculados do TST	27/06/2025	27/06/2025	Pesquisa de Precedentes Qualificados de Orgã	30/05/2025	27/05/2025	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários
	Migração dos dados	27/06/2025	04/03/2025	Aquisição de servidores de processamento de ...	24/02/2025	24/02/2025	Em encerramento	Coordenadoria de infraestrutura
	Questionário interno atualizado, com os pontos de melhoria dos resultados do Gov...	27/06/2025	23/03/2025	Melhoria dos resultados do GovTIC-JUD de 2...	02/06/2025	12/05/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC
	Revisão do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	27/06/2025	19/07/2024	Melhoria dos resultados do GovTIC-JUD de 2...	17/03/2025	14/04/2025	Concluído	Coordenadoria de Governança de TIC
	Aplicação de acesso a interesses externos	30/06/2025	05/07/2025	Manutenção evolutiva do Votor (versões, robô...	05/05/2025	05/05/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários
	Cadastro inicial dos indicadores de Desempenho de TIC	30/06/2025	20/06/2025	Elaboração de formulário no Votor e painel Po...	31/03/2025	31/03/2025	Em execução	Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial
	Consolidação dos relatórios	30/06/2025	30/06/2025	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 fase ...	15/10/2024	15/10/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos
	Consolidação dos Relatórios	30/06/2025	30/06/2025	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 fase ...	15/10/2024	15/10/2024	Concluído	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos
	Envio de dados	30/06/2025	30/09/2025	Implantação do Extrator Nacional DPAJUD - J...	09/05/2025	09/05/2025	Em encerramento	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários
	B/D/O na Solução NG	30/06/2025	26/06/2025	Nacionalização do sistema Silegia	10/02/2025	31/03/2025	Em execução	Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciários

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Julho/2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Entregas

Atualizado em 10/09/2025 13:31

Atrasada?

Não

Sim

Ano

2025

Mês

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Projeto

Todos

Entrega

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto
	Formalização do diagnóstico oficial de todos os itens que compõem o iGovTIC-JUD	04/07/2025	31/05/2025	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JU
	Integração com outros sistemas, implantação e repasse/treinamento do usuário final	04/07/2025		Sistema complementar para a Seção de
	Processos ITIL em produção em conformidade com CSJT	15/07/2025	08/08/2025	Projeto de atendimento às recomendaç
	Relatório de lotações e diárias perícias	18/07/2025	11/07/2025	Sistema Informatizado de Controle de I
	Desenvolvimento de scripts python para consultar API do zabbix e popular DW no ...	25/07/2025		Reestruturar o ambiente de monitoram
	Integração com PDPJ e implementação de novas funcionalidades	25/07/2025		PJe-AssistRRR - Assistente de Edição de I
	Integração com sistema Falcão	25/07/2025	25/07/2025	PJe-AssistRRR - Assistente de Edição de I
	Planejamento da reforma	25/07/2025	20/05/2025	Reforma da Sala de Sonorização do RB
	Divulgação do relatório da Pesquisa de Satisfação com TIC 2024 (analítico) via ASCO...	31/07/2025	24/06/2025	Acompanhamento das Ações Oriundas
	Implementar integração com PJe e-Rec	31/07/2025	31/07/2025	PJe-AssistRRR - Assistente de Edição de I
	Validação dos dados	31/07/2025	31/07/2025	Implantação do Extrator Nacional DATA

Quantidade de Entregas por Área

CSMSJ

CSMSA

CGOVTC

COSU

DSTAE

0

2

4

5

2

1

1

1

1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
05/02/2025		19/12/2024
13/02/2025		
14/02/2025		
28/02/2025		28/02/2025
06/03/2025		28/02/2025
18/03/2025		28/03/2025

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
14/11/2023	Segundo informações do servidor André Biaggi, responsável técni projeto, as seguintes atividades foram executadas até o moment o projeto do backend em Spring Boot com a parte de arquitetura definida; - Foi feita a integração com o pje-seguranca, sendo nec login para acessar o sistema; - Foi implementada a primeira cons comum, usando o token do usuário logado (consulta de process tabelas de processo e partes do processo. O sistema está buscar

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Agosto/2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Entregas

Atualizado em 10/09/2025 13:31

Atrasada?

Não

Sim

Ano

2025

Mês

☐ janeiro

☐ fevereiro

☐ março

☐ abril

☐ maio

☐ junho

☐ julho

☒ agosto

☐ setembro

☐ outubro

☐ novembro

☐ dezembro

Projeto

Todos

Entrega

Editar	Item de Entrega	Fim Previsto Entrega	Fim Efetivo Entrega	Projeto
	Período de coleta de dados em produção e ajustes necessários nos templates	01/08/2025		Reestruturar o ambiente de monitoram
	Desenvolvimento de painel de BI	08/08/2025		Reestruturar o ambiente de monitoram
	Integração com outros sistemas para coleta automatizada de Indicadores	08/08/2025	06/08/2025	Elaboração de formulário no Vetur e pa
	Levantamento manual de ex-servidores e ex-estagiários que ainda possuem acesso ...	08/08/2025	07/08/2025	Controle de Acesso Legado ao PJe
	Acesso ao ambiente de homologação do conecta.gov.br liberado	15/08/2025		Acesso ao DOU - Diário Oficial da Uniã
	Ajustes no script de criação de resultados, e recriação de novas tarefas (devido ao n...	15/08/2025	15/08/2025	Elaboração de formulário no Vetur e pa
	Desenvolvimento de Painel de indicadores de TIC	15/08/2025	15/08/2025	Elaboração de formulário no Vetur e pa
	Implantar a versão KC 26 ambiente de desenvolvimento ou outro a ser definido, co...	15/08/2025		Projeto Transferência do suporte do Ke
	Integração com e-Rec	15/08/2025		Análise de Recurso de Revista com IA
	Acesso à API do conecta.gov.br liberado	29/08/2025	18/07/2025	Acesso ao DOU - Diário Oficial da Uniã
	Implantar a versão KC 26 em ambiente de homologação ou outro a ser definido, co...	29/08/2025		Projeto Transferência do suporte do Ke
	Levantamento sobre qual normativo rege o que precisa ser publicado no DEJT, e o ...	29/08/2025		Acesso ao DOU - Diário Oficial da Uniã
	Formalização da conformidade dos processos ITIL do TRT9 pelo CSJT	31/08/2025		Projeto de atendimento às recomendaç

Quantidade de Entregas por Área

DCDIA

4

SGTIC

4

DAS

3

SCAM

2

COSGTIC

1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

Data da Alteração	Login do Usuário	Valor Anterior
24/01/2025		19/12/2024
04/02/2025		31/01/2025
05/02/2025		28/03/2025
12/02/2025		05/11/2024
12/02/2025		12/11/2024
20/02/2025		20/02/2025
26/02/2025		26/02/2025

Registros de Ocorrência

Data do Histórico	Descrição da Ocorrência
06/12/2023	Aguardando revisão do registro da demanda pelo Eduardo para encaminhamento à SGE para finalização da etapa. Att. Wellington
16/01/2024	Inseridas novas entregas e definidos prazos provisórios para esta base alterada conforme os prazos das novas entregas.
31/01/2024	Após conversa com o gerente do projeto institucional associado, Humphreys, foram definidos novos prazos e alteradas entregas e linha de base foi corrigida de acordo ficando como a linha de ba

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Setembro/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Recursos de Projetos de TI

Atualizado em 10/09/2025 13:31

Servidores STI

1

Projetos

41

Servidores TRT Alocados em Projetos

119

Realocação de Recursos

66

Servidores Atuando em Projetos

15

Projeto

Todos

Status

Todos

Gerente

Todos

Unidade Responsável

Todos

Parte Interessada

Todos

Alocação Vencida TI

Todos

Últimas alocações de Servidores de TI

Nome

Última Alocação

Eduardo Oliveira Rocha

15/01/2027

Servidores alocados em Projetos

Início

Fim

Nome

Projeto

18/11/2024

10/10/2025

Reestruturar o ambiente de reformular painéis de BI re

25/11/2024

22/08/2025

Controle de Sucessões

15/04/2024

04/03/2025

Aquisição de servidores de

19/09/2024

14/11/2025

Aquisição switches SAN - I

17/05/2023

24/01/2024

RJ-22 - Identificador AJ/JT

03/07/2023

28/11/2025

Controle de Promoção de

15/04/2024

04/03/2025

Aquisição de servidores de

19/09/2024

14/11/2025

Aquisição switches SAN - I

20/09/2024

09/01/2024

Reforma da Sala de Sonori

Servidores Atuando em Projetos

Início Previsto

Fim Previsto

Nome

Etapas

Tarefa

17/07/2023

30/11/2023

Levantament...

31/01/2025

04/03/2025

Artefatos de c...

Instalação e migração d

31/01/2025

04/03/2025

Assinatura da...

Instalação e migração d

31/01/2025

04/03/2025

Tramite Admi...

Instalação e migração d

21/08/2025

19/09/2025

Desenvolvime...

Desenvolvimento do Sis

06/06/2023

29/03/2024

Criação de consultas us

06/06/2023

29/03/2024

Desenvolvime...

Criação de consultas us


31/07/2025

29/08/2025

Desenvolvime...

Desenvolvimento do rei





TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Projetos concluídos em 2025

