



Poder Judiciário Federal  
Tribunal Regional do Trabalho da 9.<sup>a</sup> Região

**Ata/Pauta - 09.06.2026 - 11ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026 (ID 17985878)**

  
RICARDO  
ERBANO 30  
/06/2026  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 16/07  
/2026 SGTIC  
TRT9

**Agendamento (ID 17985879)**

**Data:** 09/06/2026

**Horário:** 14:00 até 15:01

**Reunião Extraordinária:** Não

**Convidados:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi  
Augusto De Almeida Prado Gava Toracio  
Claudia Shizue Watanabe  
Clemerson Keiber  
Daniel Adriano Pinto Da Silva  
Daniel Vicente Thomaz  
Eduardo Silveira Rocha  
Eladir Prados  
Filipe Lautert  
Gerusa Raquel Matos  
Hugo Signoretti Netto  
Igor Reis De Godoi  
Luis Guilherme Baptista Cordeiro  
Mike Wesley Blunk  
Omar Carvalho  
Paulo Roberto Nunes  
Ramon Pereira Molossi  
Robson Cleiton Novak  
Walter Ribeiro De Oliveira Junior

**Local da reunião:** Telepresencial

**Participantes:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi  
Augusto De Almeida Prado Gava Toracio  
Claudia Shizue Watanabe  
Clemerson Keiber  
Daniel Adriano Pinto Da Silva  
Daniel Vicente Thomaz  
Eduardo Silveira Rocha



Documento "Ata/Pauta - 09.06.2026 - 11ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2026.UJUBO.OSBVA no endereço eletrônico: [https://www.trt9.jus.br/vetor/doc\\_assinado](https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado)

Eladir Prados  
Gerusa Raquel Matos  
Hugo Signoretti Netto  
Igor Reis De Godoi  
Mike Wesley Blunk  
Omar Carvalho  
Paulo Roberto Nunes  
Ramon Pereira Molossi  
Ricardo Erbano  
Robson Cleiton Novak  
Walter Ribeiro De Oliveira Junior

  
RICARDO  
ERBANO 30  
/06/2026  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 16/07  
/2026 SGTIC  
TRT9

**Link da reunião gravada:** [https://drive.google.com/file/d/1RKLQPGN\\_vEoGlye4tLc33M4sjH1MIFEP/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1RKLQPGN_vEoGlye4tLc33M4sjH1MIFEP/view?usp=sharing)

## Itens da reunião (ID 17985887)

### Apresentação / acompanhamento projetos da TI (ID 17985888)

**Nome do item:** Apresentação / acompanhamento projetos da TI.

**Descrição:**

Mike Wesley Blunk apresentou o fluxo de monitoramento do escritório de projetos, informando a existência de dezesseis projetos em execução, um em iniciação, cinco suspensos e dois em fase de encerramento. Relatou o encerramento do projeto do robô RJ-28 Solaria e a alteração do projeto de implantação de ações do Plano de Segurança da Informação (PLSI) para a fase de encerramento. Informou o registro de cinco novas propostas de projetos aguardando autorização da Presidência. Eduardo Silveira Rocha acrescentou que, após a reunião com a Presidência, algumas propostas serão atualizadas para dar andamento às determinações recebidas. Eduardo Silveira Rocha solicitou que Daniel Adriano Pinto Da Silva passasse a incluir na pauta do Comitê de TIC (CTIC) os projetos concluídos e as entregas realizadas como forma de prestação de contas e transparência. Quanto às entregas atrasadas, Mike Wesley Blunk destacou a automação de votos com assistente de inteligência artificial, que sofreu atrasos devido a dependências da ferramenta Falcão. Sobre a desativação do sistema CTA, informou-se que a importação de processos de férias de magistrados aguarda validação da área de negócio, embora Eduardo Silveira Rocha tenha proposto a alteração do escopo para evitar a importação massiva de dados antigos. Eduardo Rocha esclareceu que, desde o dia primeiro do mês corrente, os principais expedientes já foram migrados do CTA para o VETOR. Referente à transferência de suporte do PJe, relatou-se impacto por alterações na equipe e problemas de infraestrutura em outros Tribunais e em razão da ausência de documentação e código-fonte. Mike Wesley Blunk mencionou ainda o atraso no sistema de apoio de comunicação institucional por pendências de levantamento de requisitos. Ramon Pereira Molossi explicou que novas demandas, como a integração do sistema de frota, impactaram o cronograma.





RICARDO  
ERBANO 30  
/06/2026  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 16/07  
/2026 SGTIC  
TRT9

### Solução Proposta:

-

### Deliberação:

Ricardo Erbano deve esclarecer na próxima reunião a omissão de lançamento de risco relativo à suspensão não prevista do projeto dos robôs. Daniel Adriano Pinto Da Silva deve incluir na pauta das próximas reuniões do Comitê de TIC (CTIC) os projetos concluídos e as entregas realizadas como forma de prestação de contas e transparência.

**anexo:** [Download: Projetos\\_STIC\\_09\\_06\\_2026.pdf](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

## Apresentação situação tarefas no sistema vetor (ID 19345488)

**Nome do item:** Apresentação situação tarefas no sistema vetor.

### Descrição:

Daniel Vicente Thomaz informou que os dois procedimentos para suspensão de chamados foram validados e que as adaptações de rotinas e permissões estão em curso, com previsão de conclusão em quinze dias. Houve debate sobre a conveniência de realizar registros retroativos de interrupções de chamados que ficaram parados aguardando definições. Eduardo Rocha pontuou que, apesar de os indicadores de SLA estarem sendo cumpridos, a adoção do novo procedimento permitirá uma redução gradual dos tempos médios de atendimento.

### Solução Proposta:

-

### Deliberação:

O STIC deliberou por não realizar alterações retroativas nos dados no momento, visando otimizar o esforço administrativo, visto que o SLA atual está sendo cumprido. Daniel Vicente Thomaz apresentará a funcionalidade em operação na próxima reunião ordinária.





RICARDO  
ERBANO 30  
/06/2026  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 16/07  
/2026 SGTIC  
TRT9

## Monitoramento PDTIC?: Não

### Implantação solução para suspensão de chamados para ser utilizado pelo N3 (ID 19345469)

**Nome do item:** Implantação solução para suspensão de chamados para ser utilizado pelo N3.

**Descrição:**

Daniel Vicente Thomaz apresentou a situação das tarefas da Secretaria, destacando que existe apenas uma tarefa atrasada devido à sua complexidade, enquanto as demais seguem o fluxo tempestivo. Eduardo Silveira Rocha registrou uma melhora significativa no acompanhamento. Ricardo Erbano apresentou os dados da Coordenadoria de Gestão de TIC, informando que, apesar de um pico de demandas em maio, a unidade não possui tarefas atrasadas desde março de 2026. Alexandre Tetsuo Yamauchi relatou a existência de onze tarefas próximas ao vencimento e duas que constaram como atrasadas em maio por falta de registro de encerramento no sistema, mas ressaltou que a equipe está intensificando a verificação dos prazos. Eduardo Silveira Rocha explicou que o volume de tarefas no vetor é elevado por incluir atividades recorrentes, revisões de processos e avaliações de riscos, o que garante a continuidade e a execução dos processos de trabalho independentemente dos servidores lembrarem da necessidade de execução.

**Solução Proposta:**

-

**Deliberação:**

O STIC determinou a continuidade do monitoramento das tarefas e Eduardo Silveira Rocha estabeleceu como meta para o final do ano a checagem de todos os processos de trabalho para garantir que possuam tarefas recorrentes de validação de processos cadastradas.

## Monitoramento PDTIC?: Não

### Política de utilização e armazenamento de informações (ID 19345462)

**Nome do item:** Política de utilização e armazenamento de informações.

**Descrição:**

Robson Cleiton Novak apresentou a proposta de política, com foco na utilização, tratamento e armazenamento de informações institucionais. O normativo visa



Documento "Ata/Pauta - 09.06.2026 - 11ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2026.UJUBO.OSBVA no endereço eletrônico: [https://www.trt9.jus.br/vetor/doc\\_assinado](https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado)

evitar o uso de canais não institucionais, reduzir arquivos obsoletos e reforçar as condições de custódia de dados e direitos autorais. Robson Cleiton Novak explicou que a norma revoga a Política 18/2027 (de utilização de recursos de TIC) e complementa a Política 92/2026, que regula o acesso à internet e acesso remoto aos sistemas corporativos. Eduardo Silveira Rocha destacou que a separação da gestão de dados em política própria atende à nova estratégia nacional de governança da informática do Poder Judiciário (ENGI-JUD).

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

O STIC aprovou por unanimidade a Política de Utilização e Armazenamento de Informações, que posteriormente deve ser submetida à Presidência.

**Monitoramento PDTIC?:** Não

## **Política de acesso físico aos ambientes de TIC (ID 19345455)**

**Nome do item:** Política de acesso físico aos ambientes de TIC.

### **Descrição:**

Paulo Roberto Nunes apresentou a atualização da política de acesso físico, motivada pelo questionário de maturidade do CSJT e do iGOVTIC-JUD. A nova versão integra conceitos da LGPD e regras sobre videomonitoramento. A norma diferencia ambientes restritos de TIC de ambientes críticos de TIC.

### **Solução Proposta:**

-

### **Deliberação:**

O STIC aprovou a atualização da política, mantendo a diferenciação de controles entre a capital e as unidades do interior.

**Monitoramento PDTIC?:** Não



Documento "Ata/Pauta - 09.06.2026 - 11ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2026.UJUBO.OSBVA no endereço eletrônico: [https://www.trt9.jus.br/vetor/doc\\_assinado](https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado)

## Política de controles técnicos de segurança da informação (ID 19345401)

**Nome do item:** Política de controles técnicos de segurança da informação.

**Descrição:**

Paulo Roberto Nunes apresentou esta nova política, que consolida controles técnicos de diversas normas anteriores e atende a itens de maturidade avaliados pelo CSJT. O apresentador explicou que a ausência de uma norma escrita prejudicou a pontuação do Tribunal em avaliações anteriores, ainda que os recursos técnicos, como firewall e gestão de vulnerabilidades, estivessem implementados. A política prevê a instituição de controles avançados de segurança e de programas formais para a realização de testes de intrusão. Eduardo Silveira Rocha sugeriu a inclusão de um dispositivo para garantir a prestação de contas sobre a implementação desses recursos.

**Solução Proposta:**

-

**Deliberação:**

O STIC aprovou a política com a inclusão de uma disposição transitória estabelecendo que, no prazo de dois anos, a área de tecnologia da informação deverá prestar contas das ações executadas ou apresentar justificativas para a inexecução de itens previstos. A política será encaminhada ao Comitê de Segurança da Informação.

**Monitoramento PDTIC?:** Não



RICARDO  
ERBANO 30  
/06/2026  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 16/07  
/2026 SGTIC  
TRT9




STIC- Videoconferência realizada no dia 09/06/2026  
(Painel com informações de 09/06/2026)



Escritório de Projetos de TI

Atualizado em 09/06/2026 04:25

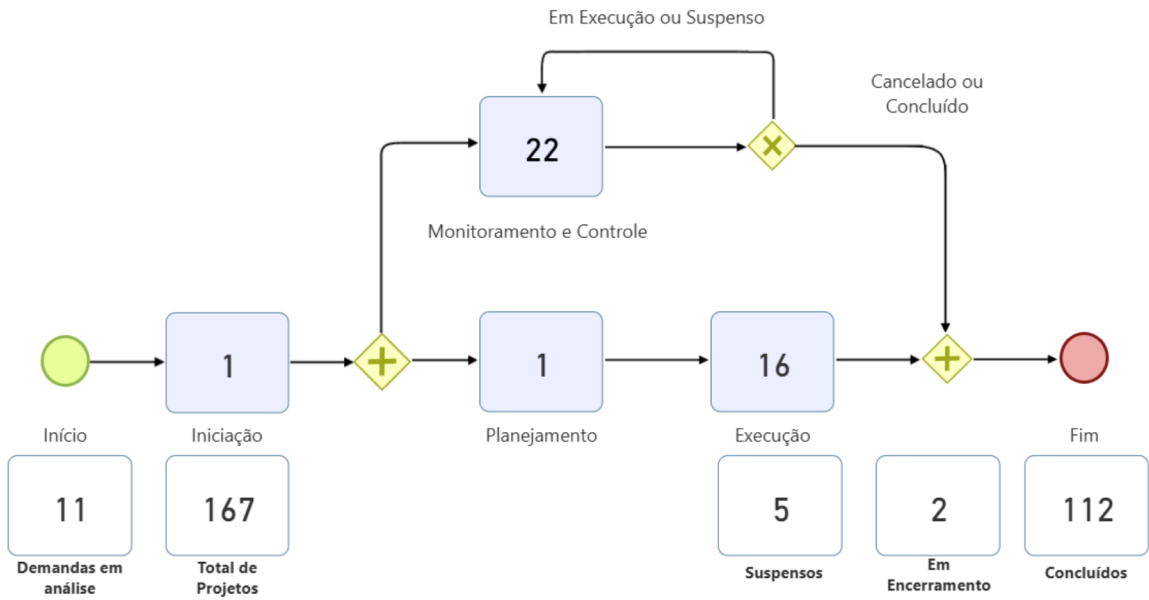

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Demandas

# Demandas

Atualizado em 09/06/2026 13:23

Total

11

Para Aprovação

10

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Programas

Escritório de Projetos

STI

Demandas

| Link | Nome da Demanda                                                           | Prioridade Demanda | Data Cadastro |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|      | Banco de Perícias                                                         | 0,80               | 30/06/2025    |
|      | Pesquisa de Jurisprudência Própria                                        | 0,64               | 19/09/2024    |
|      | Gerenciador de Documentos de Autos Físicos de Guarda Permanente           | 0,63               | 12/12/2025    |
|      | Repositório de Documentos Juízo de Execução                               | 0,63               | 12/12/2025    |
|      | Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)                            | 0,56               | 01/07/2025    |
|      | Melhoria da área de TIC em decorrência da pesquisa de satisfação 2025     | 0,54               | 09/04/2026    |
|      | Projeto de Formação para uso de Assistentes do Chat-JT                    | 0,54               | 09/01/2026    |
|      | Integração Acomps e Chat-JT                                               | 0,42               | 08/12/2025    |
|      | Federação com MPT-PR                                                      | 0,41               | 10/04/2025    |
|      | Migração do Controle de Recursos para API Java de integração Vetor/Google | 0,34               | 17/03/2025    |
|      | Acesso externo automatizado ao Falcão                                     | 0,23               | 08/12/2025    |

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Painel de Programas

Programas

Atualizado em 09/06/2026 16:30

Total

6

Projetos

168

Metas

17

Metas sem Previsão em Projeto

7

Metas sem Planejamento

10

Metas sem Tarefas

Metas Atendidas

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

Metas

| Meta                                                                               | Data para cumprir | Previsto em projeto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                                 | 31/12/21          | 1,17                |
| Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados                | 31/12/21          | 1,00                |
| Estrutura definida, criada e implantada.                                           | 31/05/22          | 1,00                |
| Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ... | 29/07/22          | 1,00                |
| Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...  | 16/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação                                     | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações                                  | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas         | 31/12/22          | 0,67                |
| Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                        | 31/12/22          | 0,17                |
| Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa      | 30/11/23          | 0,00                |
| Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...   | 30/11/23          | 0,07                |
| Número de reuniões digitalizadas para a cidadã                                     | 30/11/23          | 42,22               |

Programas

| Editar | Programas                                        | Gerente do Programa      | Dei |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----|
|        | Programa Aceleração Digital                      | Eduardo Silveira Rocha   | Se  |
|        | Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...    | Eduardo Silveira Rocha   | Se  |
|        | Programa de Governança em Privacidade            | Bráulio Gabriel Gusmão   | Se  |
|        | Programa Sistematização e organização dos at...  | Cristiane Budel Waldruff | An  |
|        | Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PJ)                   | Jaime De Brito           | An  |
|        | Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do... | Mike Wesley Blunk        | Br  |

Projetos

| Editar | Nome do Projeto                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362                                               |
|        | 256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)                                         |
|        | 256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação                               |
|        | 295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados                                                              |
|        | 306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos                                                        |
|        | 356000 - Projeto Robô Certifica Processos em lote no PJe                                                        |
|        | 289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos                                                         |
|        | 255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPI e Res. CNJ 37 |

| Total | Não Publicado | Solicitações de M... | Nenhum PO | Nenhum Respons... | Entregas Previstas | Entregas Prontas | Entregas sem Aceite | Entregas sem Aval... |
|-------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 26    | 26            | 62                   |           | 1                 | 131                | 91               | 91                  |                      |

Escritório de Projetos

STI

Área do Projeto

Todos

Programas

Todos

Status

Seleções múltiplas

Gerente

Todos

Taps

Todos

Projetos

Editar

Nome do Projeto

Acomps - Projeto de Melhorias 2026

Automação de Produção de Votos com Assistente de

Controle de Acesso ao PJE - Atividades Adicionais

Projeto Transfêrencia do suporte do Keycloak Nacio

Sistema de Apoio à Comunicação Institucional

Análise de Recurso de Revista com IA

Implantação das Ações Previstas no PLSI - Plano de

Entrega

Item de Entrega

Ajustes de Performance e Disponibilidade do Acomps

Integração Acomps com Login do MPT

Integração Acomps e Chat-JT

Otimização do MFA no Acomps.

Paralelização de Novas funcionalidades do Acomps

Percentual de Execução

| Projeto                                            | Percentual de Execução |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Acomps - Projeto de Melhorias 2026                 | 100                    |
| Automação de Produção de Votos com Assistente de   | 100                    |
| Controle de Acesso ao PJE - Atividades Adicionais  | 94                     |
| Projeto Transfêrencia do suporte do Keycloak Nacio | 93                     |
| Sistema de Apoio à Comunicação Institucional       | 85                     |
| Análise de Recurso de Revista com IA               | 80                     |
| Implantação das Ações Previstas no PLSI - Plano de | 77                     |
|                                                    | 66                     |
|                                                    | 60                     |
|                                                    | 60                     |
|                                                    | 60                     |
|                                                    | 55                     |
|                                                    | 50                     |
|                                                    | 50                     |

Percentual de Atraso

| Projeto                                            | Percentual de Atraso |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Acomps - Projeto de Melhorias 2026                 | 3887                 |
| Automação de Produção de Votos com Assistente de   | 3420                 |
| Controle de Acesso ao PJE - Atividades Adicionais  | 3420                 |
| Projeto Transfêrencia do suporte do Keycloak Nacio | 1300                 |
| Sistema de Apoio à Comunicação Institucional       | 557                  |
| Análise de Recurso de Revista com IA               | 1197                 |
| Implantação das Ações Previstas no PLSI - Plano de | 80                   |
|                                                    | 43                   |
|                                                    | 23                   |
|                                                    | 10                   |
|                                                    | 0                    |
|                                                    | 0                    |
|                                                    | 0                    |
|                                                    | 0                    |

Percentual de Adiantamento

| Projeto                                            | Percentual de Adiantamento |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Acomps - Projeto de Melhorias 2026                 | 374                        |
| Automação de Produção de Votos com Assistente de   | 308                        |
| Controle de Acesso ao PJE - Atividades Adicionais  | 282                        |
| Projeto Transfêrencia do suporte do Keycloak Nacio | 199                        |
| Sistema de Apoio à Comunicação Institucional       | 114                        |
| Análise de Recurso de Revista com IA               | 72                         |
| Implantação das Ações Previstas no PLSI - Plano de | 63                         |
|                                                    | 53                         |
|                                                    | 42                         |
|                                                    | 28                         |
|                                                    | 15                         |
|                                                    | 0                          |
|                                                    | 0                          |
|                                                    | 0                          |

Expectativas

| Editar | Nome do Projeto                                                                                                  | Status              | Gerente           | Product Owner     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|        | Acamps - Projeto de Melhorias 2026                                                                               | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Automação de Produção de Votos com Assistente de IA                                                              | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Controle de Acesso ao PJe - Atividades Adicionais                                                                | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Projeto Transferência do suporte do Keycloak Nacional (Sigeo) do TRT-22 para o TRT9                              | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Sistema de Apoio à Comunicação Institucional                                                                     | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Análise de Recurso de Revista com IA                                                                             | Em homologação      | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Implantação das Ações Previstas no PLSI - Plano de Segurança da Informação (2025/2026)                           | Em encerramento     | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Otimização do Gerenciamento da Central de Serviços                                                               | Suspensão           | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Painel de resultados de governança e gestão TRT9                                                                 | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Pesquisa de Precedentes Qualificados de Órgãos Colegiados do TRT9                                                | Em encerramento     | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | ASSIST-RR MELHORIAS                                                                                              | Suspensão           | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Migração de aplicações para Docker                                                                               | Suspensão           | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Nacionalização do sistema Salaria                                                                                | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Projeto Instalação do Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) do TRT14 para testes no TRT9                  | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | RJ-22 - Identificador AJ/JT                                                                                      | Suspensão           | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | RJ-29 robô de redistribuição e equalização de processos em 1º Grau no TRT9                                       | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Sistema complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1º Grau                                        | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Evolução dos recursos tecnológicos de videoconferência dentro das Sala de Audiências                             | Em iniciação        | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Reestruturar o ambiente de monitoramento do uso das impressoras de rede do TRT9 e reformular painéis de BI re... | Necessita replan... | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Desativação do Sistema de Controle de Tramitação Administrativo (CTA)                                            | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Execução integral do processo de contratações, no TRT do Paraná, via Votor                                       | Em planejamento     | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | GPrec : movimentações financeiras                                                                                | Suspensão           | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2026 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370/2021)                    | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Nacionalização do modelo de colegiados temáticos do vetor                                                        | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Reforma da Sala de Sonorização do RB528                                                                          | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |
|        | Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em regime de trabalho ...  | Em execução         | Renato de Almeida | Renato de Almeida |

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Entregas

**Dezembro/2025**

# Entregas

Atualizado em 09/06/2026 16:30

Atrasada?

Não

Sim

Ano

2025

Mês

☐ janeiro

☐ fevereiro

☐ março

☐ abril

☐ maio

☐ junho

☐ julho

☐ agosto

☐ setembro

☐ outubro

☐ novembro

☒ dezembro

Quantidade de Entregas por Área

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

| Data da Alteração | Login do Usuário | Valor Anterior |
|-------------------|------------------|----------------|
| 22/07/2025        |                  | 27/06/2025     |
| 22/07/2025        |                  | 11/07/2025     |
| 22/07/2025        |                  | 16/07/2025     |
| 22/07/2025        |                  | 29/08/2025     |
| 22/07/2025        |                  | 18/12/2025     |
| 04/08/2025        |                  | 31/07/2025     |
| 04/08/2025        |                  | 15/08/2025     |

Registros de Ocorrência

| Data do Histórico | Descrição da Ocorrência |
|-------------------|-------------------------|
| 06/12/2023        |                         |
| 16/01/2024        |                         |
| 31/01/2024        |                         |

Projeto

Todos

Entrega

| Editar | Item de Entrega                                      | Fim Previsto Entrega | Fim Efetivo Entrega | Projeto                                          | Início Previsto Entrega | In |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----|
|        | Implantar a versão KC 26 ambiente de desenvolvim...  | 18/12/2025           | 02/02/2026          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 05/11/2024              |    |
|        | Implantar a versão KC 26 em ambiente de homolog...   | 18/12/2025           | 02/02/2026          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 18/08/2025              |    |
|        | Criação de modelo para cadastro de novos atos ad...  | 05/12/2025           | 17/12/2025          | Sistematização de atos normativos                | 01/09/2025              |    |
|        | Implantar a versão KC 26 em ambiente de produção     | 18/12/2025           | 25/05/2026          | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 01/09/2025              |    |
|        | Atendimento de chamados 100% realizado pelo TRT9     | 18/12/2025           |                     | Projeto Transferência do suporte do Keycloak ... | 04/09/2025              |    |
|        | Versão 1.0 (Sistema de Eventos)                      | 05/12/2025           | 05/12/2025          | Sistema para Gestão de Eventos                   | 11/09/2025              |    |
|        | Execução do serviço de reforma de engenharia         | 19/12/2025           | 19/12/2025          | Reforma da Sala de Sonorização do RB528          | 07/10/2025              |    |
|        | Carregar os dados dos colegiados temáticos nacion... | 02/12/2025           | 02/12/2025          | Nacionalização do modelo de colegiados tem...    | 17/11/2025              |    |
|        | Revisar o modelo atual ou criar um novo modelo pa... | 02/12/2025           | 02/12/2025          | Nacionalização do modelo de colegiados tem...    | 17/11/2025              |    |
|        | Revisar robôs do modelo para adaptar ao modelo n...  | 02/12/2025           | 02/12/2025          | Nacionalização do modelo de colegiados tem...    | 17/11/2025              |    |


**Abril/2026**

| Registros de Ocorrência |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do Histórico       | Descrição da Ocorrência                                                                                                                                                                        |
| 06/12/2023              | Aguardando revisão do registro da demanda pelo Eduardo para encaminhamento à SGE para finalização da etapa. Atai. Wellington                                                                   |
| 16/01/2024              | Inseridas novas entregas e definidos prazos provisórios para esta base alterada conforme os prazos das novas entregas.                                                                         |
| 31/01/2024              | Após conversa com o gerente do projeto institucional associado, Humphreys, foram definidos novos prazos e alterações entregues e linha de base foi gerada da seguinte forma: com a linha de ba |





**TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos**  
**PDS**

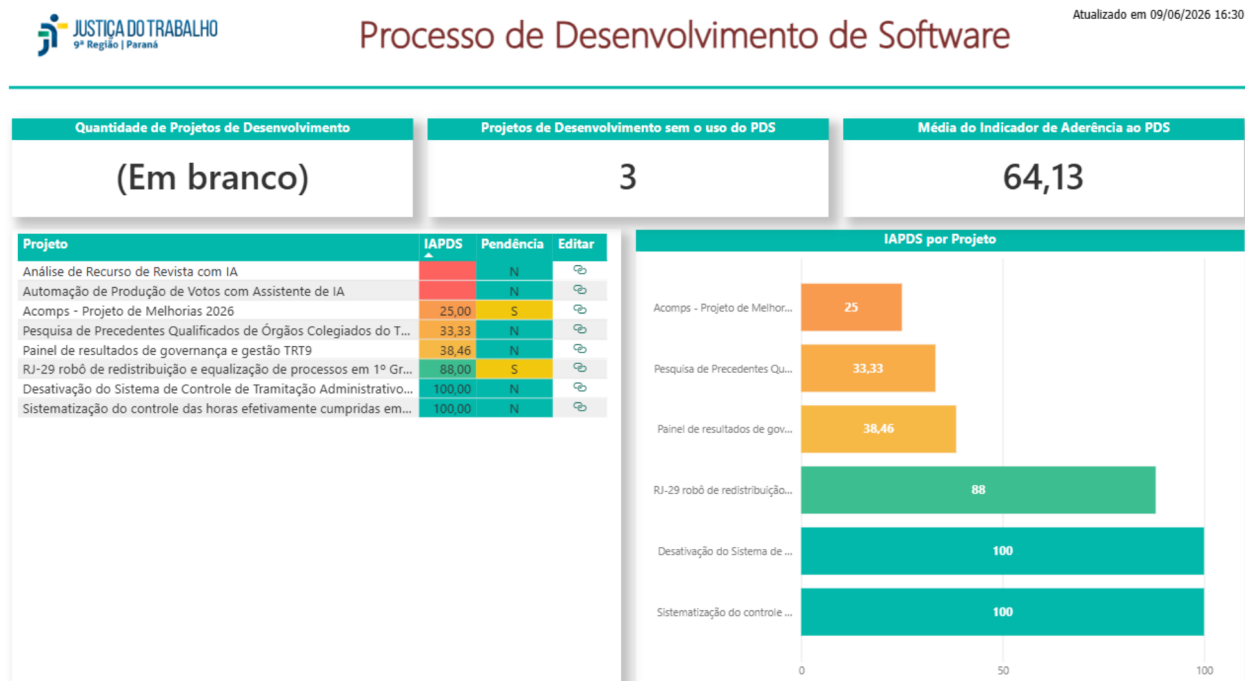

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Painel de Riscos

Arquivo ▾Exibir ▾Explorar ▾Atualizar

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Riscos em Projetos de TI

Atualizado em 09/06/2026 16:30

49

Projetos com incidência de risco

10

Quantidade de riscos que podem ocorrer em projetos

2

Quantidade de riscos incidentes

(Em branco)

% Ocorrência

Risco

Qtd. de Projetos

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Alterações nos requisitos passados pelos stakeholders do projeto | 31 |
| Atraso em entrega do projeto                                     | 37 |
| Ausência de recursos humanos e ou financeiros no projeto         | 24 |
| Baixa disponibilidade da equipe do projeto                       | 40 |
| Desconhecimento da equipe do projeto                             | 9  |
| Falta de comprometimento da área fim do projeto                  | 20 |
| Indefinição do PO das regras de negócio do projeto               | 21 |
| Total                                                            | 49 |

Editar

Projeto

|                                                                                                                                     |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 334646 - Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em regime de trabalho extraordinário | 2 | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|

Qtd de Projetos por RISCO

Desconhecimento da equipe do pr...

Baixa disponibilidade da equip...

Falta de comprometim...

Indefinição do ...

Ausência de recursos...

Atraso em entrega ...

Alterações nos requisitos passados p...

Qtd Risco Incidente e Qtd Ocorrências por Projeto

1,0

0,5

0,0

334646

Data da Ocorrência

10/05/202611/05/2026

Data

Nº Proj.

Ocorrência

11/05/2026334646

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Projetos concluídos em 2026

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Atualizado em 09/06/2026 16:30

Projetos Concluídos por Período

| Data na situação concluído      |                                                    |                                                                              |                 |               |            |            | Projetos concluídos no período |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|
| <div>01/01/202629/05/2026</div> |                                                    |                                                                              |                 |               |            |            | 8                              |
| Editar                          | Projeto                                            | Descrição                                                                    | Área do Projeto | Data de En... | Início     | Fim        | Duração...                     |
|                                 | 332577 - Sistema Informatizado de Controle d...    | Trata-se de substituição de controle em planilha Excel, para um sistema i... | CSMSA           | 15/01/2026    | 01/12/2024 | 12/09/2025 | 285                            |
|                                 | 280147 - Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudê...   | Criar um sistema unificado de jurisprudência do TRT9 a fim de permitir ...   | CSMSJ           | 23/01/2026    | 07/04/2022 | 30/09/2025 | 1272                           |
|                                 | 316267 - Sistema de acionamento emergencia...      | Sistema que permita por meio de aplicativo e/ou hardware específico q...     | CSMSA           | 29/01/2026    | 07/03/2024 | 29/01/2026 | 693                            |
|                                 | 286172 - Controle de Recursos - Segurança Pa...    | Desenvolvimento de uma ferramenta que possa auxiliar a gestão de rec...      | CSMSA           | 02/02/2026    | 27/03/2023 | 02/02/2026 | 1043                           |
|                                 | 356134 - Sistema para Gestão de Eventos            | Desenvolvimento de aplicação para gerar listas de convidados para eve...     | CSMSA           | 24/02/2026    | 11/09/2025 | 24/02/2026 | 166                            |
|                                 | 305842 - Sistematização de atos normativos         | O projeto será responsável pelo ciclo de desenvolvimento de um sistem...     | CSMSA           | 19/03/2026    | 07/11/2023 | 31/07/2026 | 997                            |
|                                 | 295667 - Desativação do Office                     | Desativação do pacote office que será substituído pelas ferramentas Go...    | CGSI            | 24/04/2026    | 22/03/2023 | 27/04/2026 | 1132                           |
|                                 | 333074 - RJ-28 - Certifica a alteração de statu... | A cada alteração de status da requisição de pagamento no sistema AJ/J...     | CSMSJ           | 04/05/2026    | 17/10/2024 | 30/06/2026 | 621                            |

